



PERÚ

Ministerio
de Defensa

Instituto Nacional
de Defensa Civil

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la universalización de la salud"

MEMORÁNDUM N° 019-2020-INDECI/44.0



A : ING. JULIO CESAR ALVITES LOPEZ
Coordinador de la Unidad Funcional STCM FONDES

Asunto : Correr traslado de Informe Final de la Intervención denominada "Limpieza y Descolmatación de la Quebrada Magapash y Lindero" con recursos del FONDES

Ref. : Oficio N° 042-2020-MDT/A

Fecha : Huánuco, 24 enero del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar que a través del documento de la referencia, esta Dirección Desconcentrada ha recibido por parte de la **Municipalidad Distrital de Tomayquichwa**, expediente para ser elevado a la Comisión Multisectorial del Fondo para inversiones ante ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES, Informe de seguimiento a la actividad denominada "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA LINDRO POR DESASTRES ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LINDERO, DISTRITO DE TOMAY-KICHWA, PROVINCIA DE AMBO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL DS N° 026-2019-PCM" por el monto de S/ 187,648.00 en el marco del Decreto Supremo N° 026-2019-PCM. El mismo que cumplimos en remitir en (23) folios.

Atentamente,


Lic. Carlos A. Pinillos de Orbegoso
DIRECTOR DDI - HUÁNUCO
INDECI

C.c. Archivo
N° Operación: 000655
0006455



"Año de la Universalización de la Salud"

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY-KICHWA
PROVINCIA DE AMBO – REGION HUANUCO**

Plaza de Armas S/N

Tomay-kichwa, 22 de Enero del 2020

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA
INDECI HUANUCO
TRAMITE DOCUMENTARIO
La Recepción no es señal de conformidad

23 ENE. 2020

N° Reg: _____ Folio: 23
Hora: _____ Mon: 16:47

OFICIO N° 042 – 2020 – MDT/A

Señor (a) : DR. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION MULTISECTORIAL
DE FONDES.

Asunto : REMITO INFORME FINAL DE LA INTERVENCION DENOMINADA:
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA
"MAGAPASH Y LINDERO" CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL
FONDES.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo en nombre de la Municipalidad Distrital de Tomay-kichwa que dignamente me honro representar y seguidamente remitirle el informe final de la intervención denominada: limpieza y descolmatación de la quebrada "Magapash y Lindero" en el distrito de Tomay-kichwa, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, las cuales fueron ejecutados con recursos asignados por el FONDES. Para cuyo efecto anexo informe final en 23 folios.

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes y aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi estima personal.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAYKICHWA
AMBO - HUANUCO



Juan Aguirre Avila
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA
PROVINCIA DE AMBO – REGIÓN HUÁNUCO
“OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL”



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

INFORME N° 012-2019-ODUyR/PVT

A : **ARQ. ROSMAN CALIXTO LASTRA**
Gerente Municipal de la MDT

DE : **PORFIRIO VIGILIO TUCTO**
Responsable de la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural

ASUNTO : **INFORME FINAL DE LA INTERVENCIÓN DENOMINADA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS “MAGAPASH” Y “LINDERO” CON LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES**

FECHA : TOMAYKICHWA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Por medio del presente es grato dirigirme a Usted con la finalidad de saludarlo y a la vez presentarle el INFORME FINAL DE LA INTERVENCIÓN DENOMINADA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS “MAGAPASH” Y “LINDERO” CON LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES. Al mismo tiempo informarle que los trabajos se encuentran culminados como se muestra en las fotografías que se adjunta.

Adjunto:

- **INFORME FINAL**
- **TOMAS FOTOGRAFICAS**

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines que estime correspondiente.

Atentamente

PORFIRIO VIGILIO TUCTO
Responsable de la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural



INFORME FINAL – QUEBRADA “LINDERO”
DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES
(Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)

I. CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE:

100208 – Municipalidad Distrital de Tomay Kichwa

II. CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

300902 – Municipalidad Distrital de Tomay Kichwa

III. NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:

“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA “LINDERO”; POR DESASTRES ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LINDERO, DISTRITO DE TOMAY-KICHWA, PROVINCIA DE AMBO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA DE ACUERDO D.S N° 026-2019-PCM”.

IV. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- Departamento: Huánuco
- Provincia: Ambo
- Distrito: Tomay - Kichwa
- Localidad: Lindero
- Coordenadas UTM de la intervención:

Progresiva 0+000 - 0+815
Inicio ESTE: 368214.42.87 m; NORTE: 8883580.31 m
Fin ESTE: 367400.18 m; NORTE: 8883479.48 m

V. ANTECEDENTES

Describir:

- D.S. N° 026-2019-PCM
- N° del Registro SINPAD 0098566
- D.S. N° 265-2019-EF
- Resolución 169-2019-MDT/A con fecha de 23 de agosto del 2019.

VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Con la finalidad de solucionar los daños ocasionados por el Flujo de Detritos en la quebrada “Lindero”, se intervendrá el tramo colmatado por material pétreo, flujo de detritos.

Esta actividad de emergencia se efectuará con los siguientes trabajos:

I. Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada en 01 glb:

- 01 MÁQUINA (excavadora) EN CAMIÓN CAMA BAJA;
- 01 TRACTOR DE 190-240 HP

Serán movilizados y desmovilizados desde la ciudad de Huánuco hasta las zonas de intervención en la localidad "Lindero" Distrito de Tomay-kichwa, provincia de Ambo, Departamento de Huánuco.

2. Limpieza y descolmatación de 5,939.31 m³ de material de flujo de detritos con cantos rodados en su totalidad en cauce de la quebrada Lindero, en una longitud total de 815 ml que será realizado con las siguientes maquinarias:

- 01 TRACTOR 190-240 HP.

3. Conformación de Diques con material propio y protección con roca al volteo, se ejecutará la conformación de diques al volteo con material propio principalmente en la margen izquierda y derecha de la quebrada "Lindero", donde se encuentran las viviendas, en un volumen de 5,939.31 m³ y en una longitud de 815 ml. Dicho trabajo será realizado con:

- 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 115 A 165 HP.

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

La población beneficiada directamente en el Anexo de Lindero, distrito de Tomay-kichwa es de 20 viviendas, con un aproximado 100 habitantes.

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Vivienda	Población
HUÁNUCO	AMBO	TOMAY-KICHWA	LINDERO	20	100

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

Limpieza y descolmatación de la quebrada "Lindero", en la localidad de Tomay-kichwa, distrito de Tomay-kichwa, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, en una longitud total de 815.00 m. y en un volumen de 5,939.31 m³, que será intervenido en un solo tramo crítico, en las siguientes progresivas:

MÉTAS DEL SERVICIO

- **TRAMO 1: 464 m.**
Progresiva (00+000 - 00+464)
 1. Con relación al contrato de locación de servicio N° 118 – 2019 – MDT/A, y tal como señalan los términos de referencia la meta del servicio es la disponibilidad de una excavadora sobre oruga de 115-165 HP y un volquete de 15 m³, para el tramo 1, del Km. 00+000 hasta el Km. 00+464, haciendo un total 464 m. Haciendo un tiempo de 20 días calendarios.
- **TRAMO 1: 351 m.**
Progresiva (00+464 - 00+815)
 2. Con relación al contrato de locación de servicio N° 117 – 2019 – MDT/A, y tal como señalan los términos de referencia la meta del servicio es la disponibilidad de una excavadora sobre oruga de 115-165 HP y dos volquetes de 15 m³, para

el tramo 2, Km. 00+464 hasta Km. 00+815, haciendo un total 351 m. Haciendo un tiempo de 20 días calendarios.

• Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA "MAGAPASH"; POR DESASTRES ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE MAGAPASH, DISTRITO DE TOMAY-KICHWA, PROVINCIA DE AMBO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA DE ACUERDO D.S N° 026-2019-PCM".			
	METAS FÍSICAS			
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
Excavadora sobre oruga y volquete (km 0+000 al 0+464)	m	464	464	0
Excavadora sobre oruga y dos volquetes (km 0+464 al 0+815)	m	351	251	100

• Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA "MAGAPASH"; POR DESASTRES ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE MAGAPASH, DISTRITO DE TOMAY-KICHWA, PROVINCIA DE AMBO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA DE ACUERDO D.S N° 026-2019-PCM".		
	METAS FINANCIERAS		
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	MONTO PROGRAMADO (1)	MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) - (2)
Excavadora sobre oruga y volquete (km 0+000 al 0+464)	27,924.00	27,924.00	0.00
Excavadora sobre oruga y dos volquetes (km 0+464 al 0+815)	30,500.00	27,450.00	3,050.00
TOTAL (S/)	58,424.00	55,374.00	3,050.00

IX. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDAD										
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA "LINDERO"; POR DESASTRES ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LINDERO, DISTRITO DE TOMAYKICHWA, PROVINCIA DE AMBO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA DE ACUERDO D.S N° 026-2019-PCM".										
ITEM	DESCRIPCIÓN PARTIDA	UNIDAD	METRADO	P. UNIT.	PARCIAL	SEMANAS (DÍAS HÁBILES)				
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
						S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
01.01	OBRA PRELIMINAR									
01.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO	GLB	2.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00				1,000.00
01.02	ACUBIERTOS DE TERRENO									
01.02.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA "LINDERO"	M3	5,938.31	4.75	28,211.72	7,052.93	7,052.93	7,052.93	7,052.93	
01.02.02	CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION CON ROSCA AL VOLTEO	M3	5,938.31	4.75	28,211.72					
COSTO DIRECTO						58,423.45	8,052.83	14,105.86	14,105.86	8,052.83
TOTAL						58,423.45	8,052.83	14,105.86	14,105.86	8,052.83

- Fecha de inicio de ejecución física: 27 de setiembre del 2019.5
- Fecha de término de la ejecución física: 21 de octubre del 2019

X. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

En la progresiva (00+666.36 – 00+815) no se realizaron los trabajos de limpieza y descolmatación de la quebrada "Lindero" en un volumen total de 593.93 m³ debido a que los propietarios de los terrenos por donde pasa la quebrada, progresiva (00+666.36 – 00+815), se opusieron a los trabajos según estaba en el informe técnico, por lo que solo se realizaron trabajos de limpieza y descolmatación en un ancho de 1.5 m, como se muestran en las fotografías adjuntadas. Siendo lo ejecutado un total de 5,345.38.

XI. CONCLUSIONES

Se ha culminado la obra con dificultades explicadas líneas arriba debido a la negativa de los propietarios.

XII. RECOMENDACIONES

Al quedar 593.93 m³ (10% de obra) pendientes en la Limpieza y Descolmatación de la quebrada "Lindero", se recomienda a la entidad realizar los procedimientos pertinentes.

XIII. ANEXOS

a. PANEL FOTOGRÁFICO

Fotografía N° 1: Inicio de los trabajos de Limpieza y descolmatación.



Fotografía N° 2: Inicio de los trabajos de descolmatación con Excavadora sobre oruga de 115-165 HP



Fotografía N° 3: Trabajos de descolmatación con Excavadora sobre oruga de 115-165 HP.



Fotografía N° 4: Trabajos de Limpieza y descolmatación con Excavadora sobre oruga de 115-165 HP.



Fotografía N° 5: Trabajos de transporte de material con Volquete de 15 m3.



Fotografía N° 6: Trabajos de transporte de material con Volquete de 15 m3.



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY Nº 30453
FONDO PARA INTERVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS
 DECRETO SUPLENTE Nº 132-2017-EP
 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
 (Artículo Nº 13, numeral 13.1 y 13.3)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL Nº 002

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA	CODIGO DEL PLIEGO	100208
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA	CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA	300902
DECRETO SUPLENTE QUE AUTORIZA LOS RECURSOS	265-2019-EF	FECHA DE APROBACIÓN DEL DECRETO SUPLENTE	21/08/2019
REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES	DICIEMBRE	FECHA DEL REPORTE	18/12/2019
TIPO DE INTERVENCIÓNES	Limpieza y Descolmatación de la Quebrada "Lindero"		
Nº DE INTERVENCIÓNES	1		

Nº	DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	UBICACIÓN				Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/	Nº de Resolución de Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Monto de la Incorporación			Avance Físico			Avance % (en %)	Unidad de medida (UM)	Meta Física prevista mensual (e)	Meta Física ejecutada mensual	Meta Física ejecutada acumulada	Avance % (en %)					
		Región	Provincia	Distrito	Localidad					GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3							GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6
1	Limpieza y Descolmatación de la Quebrada "Lindero"	HUANUCO	AMBO	TOMAY KICHWA	LINDERO	20	30500	169-2019-MDT	23/08/2019	30500	30500	30500	27450	27450	27450	0.15	GLB	1.00	90%	90%	0.90					
2	Limpieza y Descolmatación con conformación de Diques con material propio de la Quebrada "Lindero"	HUANUCO	AMBO	TOMAY KICHWA	LINDERO	20	27924	169-2019-MDT	23/08/2019	27924	27924	27924	27924	27924	27924	0.15	GLB	1.00	100%	100%	1.00					
TOTAL											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30%									

Tipo de Intervenciones	Nº (*)
Mitigación y Capacidad de Respuesta	1
Peligro Inminente, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

Firma y Sello:
 Nombre: **RODRIGO MORALES TORRES**
 Cargo: **GERENTE MUNICIPAL**

Firma y Sello:
 Nombre: **RODRIGO MORALES TORRES**
 Cargo: **GERENTE MUNICIPAL**

Firma y Sello:
 Nombre: **RODRIGO MORALES TORRES**
 Cargo: **GERENTE MUNICIPAL**

INFORME FINAL – QUEBRADA “MAGAPASH”

DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES

(Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)

I. CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE:

100208 – Municipalidad Distrital de Tomay Kichwa

II. CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

300902 – Municipalidad Distrital de Tomay Kichwa

III. NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:

“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA “MAGAPASH”; POR DESASTRES ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE MAGAPASH, DISTRITO DE TOMAY-KICHWA, PROVINCIA DE AMBO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA DE ACUERDO D.S N° 026-2019-PCM”.

IV. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- Departamento: Huánuco
- Provincia: Ambo
- Distrito: Tomay - Kichwa
- Localidad: Magapash
- Coordenadas UTM de la intervención:

Progresiva 0+000 - 0+744

Inicio ESTE: 365223.87 m; NORTE: 8888180.78 m

Fin ESTE: 365823.07 m; NORTE: 8888507.46 m

V. ANTECEDENTES

Describir:

- D.S. N° 026-2019-PCM
- N° del Registro SINPAD 0098566
- D.S. N° 265-2019-EF
- Resolución 169-2019-MDT/A con fecha de 23 de agosto del 2019.

VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Con la finalidad de solucionar los daños ocasionados por la quebrada “Magapash”, se intervendrá los tramos colmatados por material pétreo, flujo de detritos. Consistente en la limpieza y descolmatación de la quebrada “Magapash”, en un volumen de 13,392.00 m3. Esta actividad de emergencia se efectuará con los siguientes trabajos:

1. Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada en 01 glb:

- 01 TRACTOR SOBRE ORUGA 190-240 HP. (con Camión Cama Baja)
Serán movilizados y desmovilizados desde la ciudad de Huánuco hasta las zonas de intervención en la localidad “Magapash” distrito de Tomay-kichwa, provincia de Ambo, departamento de Huánuco.

2. Limpieza y descolmatación de 13,392.00 m³ de material de flujo de detritos con cantos rodados en su totalidad en cauce de la quebrada Magapash, en una longitud total de 744 m. que será realizado con las siguientes maquinarias:

- 01 TRACTOR SOBRE ORUGA 190-240 HP.

3. Conformación de Diques con material propio y protección con roca al volteo, se ejecutará la conformación de diques al volteo con material propio a fin de proteger principalmente en la margen izquierda de la quebrada "Magapash", donde se encuentran las viviendas, en un volumen de 13,392.00 m³ y en una longitud de 744 m. Dicho trabajo será realizado con:

- 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 115-165 HP.

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

La población beneficiada directamente en la localidad de Magapash, distrito de Tomay-kichwa es de 30 viviendas, con un aproximado 115 habitantes.

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Vivienda	Población
HUANUCO	AMBO	TOMAY-KICHWA	MAGAPASH	30	150

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

Limpieza y descolmatación de la quebrada "Magapash", en la localidad de Tomay-kichwa, distrito de Tomay-kichwa, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, en una longitud total de 744.00 m. Y en un volumen de 13,392.00 m³, que será intervenido en dos tramos críticos, en las siguientes progresivas:

METAS DEL SERVICIO

- **TRAMO 1: 455 m.**
Progresiva (0+000 - 0+455)
 1. Con relación al contrato de locación de servicio N° 123 – 2019 – MDT/A, y tal como señalan los términos de referencia la meta del servicio es la disponibilidad excavadora sobre oruga de 125-165 HP, para el tramo 1, del Km. 00+000 hasta el Km. 00+455, haciendo un total 455 m. Haciendo un tiempo de 20 días calendarios.
 2. Con relación al contrato de locación de servicio N° 122 – 2019 – MDT/A, y tal como señalan los términos de referencia la meta del servicio es la disponibilidad 02 volquetes de 15m³, para el tramo 1, del Km. 00+000 hasta el Km. 00+455, haciendo un total 455 m. Haciendo un tiempo de 20 días calendarios.
- **TRAMO 2: 289 m.**
Progresiva (0+455 - 0+744)
 1. Con relación al contrato de locación de servicio N° 119 – 2019 – MDT/A, y tal como señalan los términos de referencia la meta del servicio es la

disponibilidad de dos volquetes de 15 m3 para el tramo 2, Km. 00+455 hasta Km. 00+744, haciendo un total 289 m. Haciendo un tiempo de 20 días calendarios.

2. Con relación al contrato de locación de servicio N° 121 – 2019 – MDT/A, y tal como señalan los términos de referencia la meta del servicio es la disponibilidad de maquinaria pesada excavadora sobre oruga de 115-165 HP para el tramo 2, Km. 00+455 hasta Km. 00+744, haciendo un total 289 m. Haciendo un tiempo de 20 días calendarios.

• **TRAMO 1 Y 2: 744 m.**
Progresiva (0+455 - 0+744)

1. Con relación al contrato de locación de servicio N° 120 – 2019 – MDT/A, y tal como señalan los términos de referencia la meta del servicio es la disponibilidad de camión cama baja para el traslado de maquinaria pesada para el tramo 1 y 2, del Km. 00+000 hasta el Km. 00+744, haciendo un total 744 m. Haciendo un tiempo de 25 días calendarios.

• Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA "MAGAPASH"; POR DESASTRES ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE MAGAPASH, DISTRITO DE TOMAY-KICHWA, PROVINCIA DE AMBO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA DE ACUERDO D.S N° 026-2019-PCM".				
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
Excavadora sobre oruga (km 0+000 al 0+455)	m	455	455	0
Excavadora sobre oruga (km 0+455 al 0+744)	m	289	289	0
Volquete (km 0+000 al 0+455)	m	455	455	0
Volquete (km 0+455 al 0+744)	m	289	289	0
Camión cama baja (km 0+000 al 0+744)	m	744	744	0

• Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA "MAGAPASH"; POR DESASTRES ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE MAGAPASH, DISTRITO DE TOMAY-KICHWA, PROVINCIA DE AMBO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA DE ACUERDO D.S N° 026-2019-PCM".			
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FINANCIERAS		
	MONTO PROGRAMADO (1)	MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) - (2)
Excavadora sobre oruga (km 0+000 al 0+455)	32,500.00	32,500.00	0.00
Excavadora sobre oruga (km 0+455 al 0+744)	32,000.00	32,000.00	0.00
02 volquetes (km 0+000 al 0+455)	29,500.00	29,500.00	0.00

02 volquetes (km 0+455 al 0+744)	26,800.00	26,800.00	0.00
Camión cama baja (km 0+000 al 0+744)	8,424.00	8,424.00	0.00
TOTAL S/	129,224.00	129,224.00	0.00

IX. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE FISICO DE ACTIVIDAD

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA "MAGAPASH"; POR DESASTRES ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE MAGAPASH, DISTRITO DE TOMAYKICHWA, PROVINCIA DE AMBO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA DE ACUERDO D.S N° 026-2019-PCM".

ITEM	DESCRIPCIÓN PARTIDA	UNIDAD	METRADO	P. UNIT.	PARCIAL	SEMANAS (DIAS HABILIS)				
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
						S/	S/	S/	S/	S/
01 01	OBRAS PRELIMINARES									
01 01 01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO	GLB	2.00	1.000.00	2.000.00	1.000.00				1.000.00
01 02	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01 02 01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA "MAGAPASH"	MD	13.392.00	4.75	63.612.00	12.722.40	12.722.40	12.722.40	12.722.40	12.722.40
01 02 02	CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL PROPIO AL VOLTEO	MD	13.392.00	4.75	63.612.00		15.903.00	15.903.00	15.903.00	15.903.00
COSTO DIRECTO					129.224.00	13.722.40	28.625.40	28.625.40	28.625.40	29.625.40
TOTAL					129.224.00	13.722.40	28.625.40	28.625.40	28.625.40	29.625.40

- Fecha de inicio de ejecución física: 27 de setiembre del 2019.
- Fecha de término de la ejecución física: 21 de octubre del 2019

X. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

No se presentó ninguna dificultad en ningún rubro correspondiente.

XI. CONCLUSIONES


Se ha culminado la obra sin ningún percance siguiendo todos los lineamientos del Expediente Técnico.

XII. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar los procedimientos respectivos posteriores a este informe.

XIII. ANEXOS

a. PANEL FOTOGRÁFICO

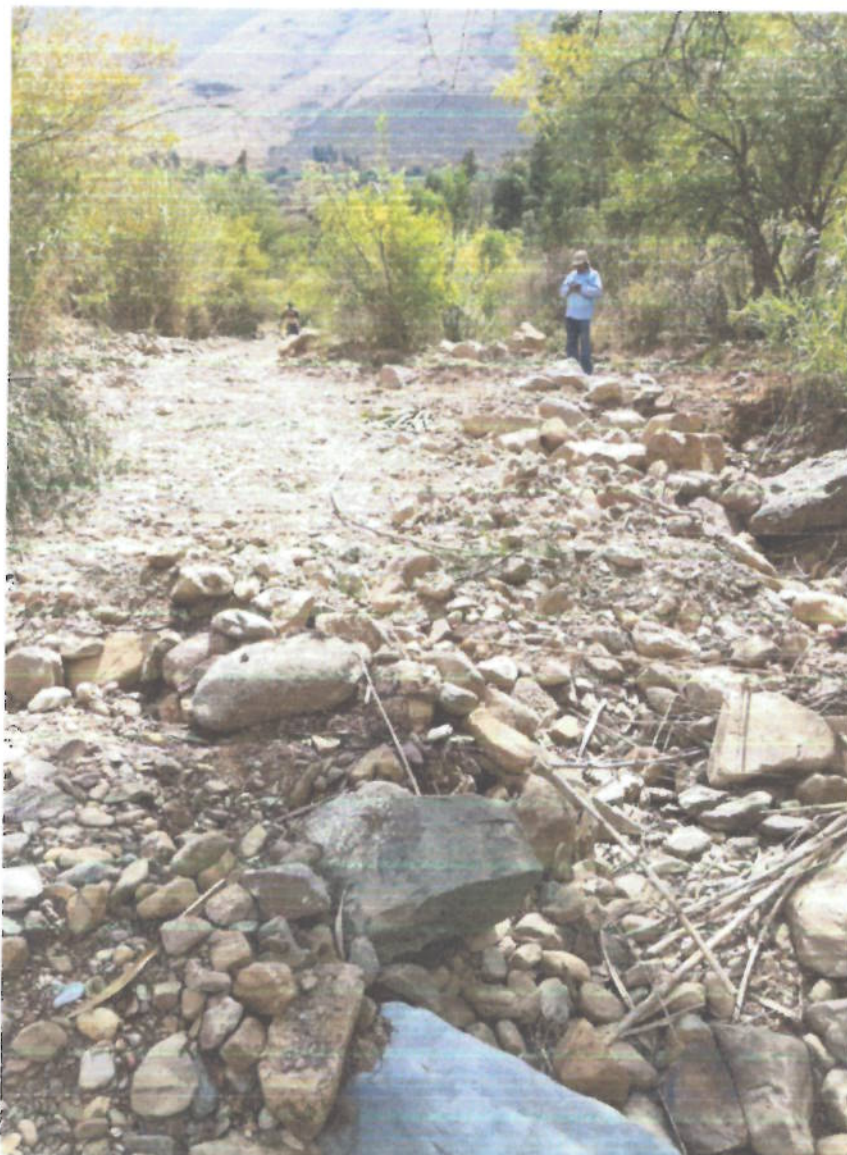

Fotografía N° 1: Inicio de los trabajos de Limpieza y descolmatación.



Fotografía N° 2: Inicio de los trabajos de descolmatación con Excavadora sobre oruga de 115-165 HP.



Fotografía N° 3: Trabajos de descolmatación con Excavadora sobre oruga de 115-165 HP.




Fotografía N° 4: Trabajos de Limpieza y descolmatación con Excavadora sobre oruga de 115-165 HP.



Fotografía N° 5: Trabajos de descolmatación con Excavadora sobre oruga de 115-165 HP.



Fotografía N° 6: Trabajos de transporte de material con Volquete de 15 m3.

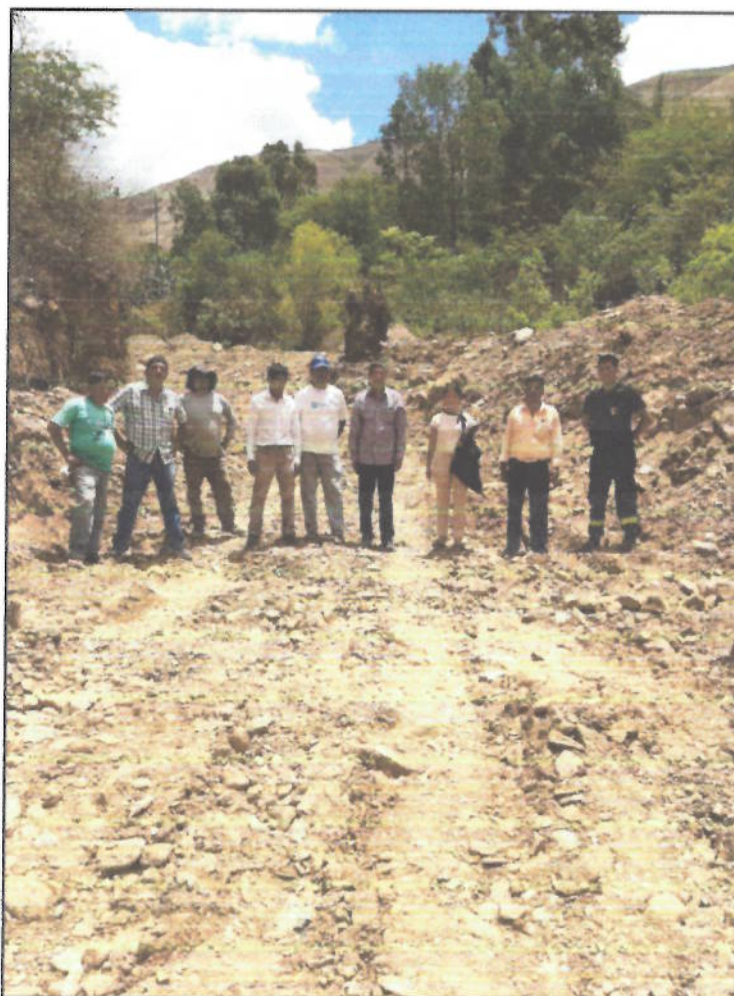


Fotografía N° 7: Trabajos de limpieza.



Fotografía N° 8: Trabajos de descolmatación con Excavadora sobre oruga de 115-165 HP.



Fotografía N° 9: Trabajos de descolmatación con Excavadora sobre oruga de 115-165 HP.

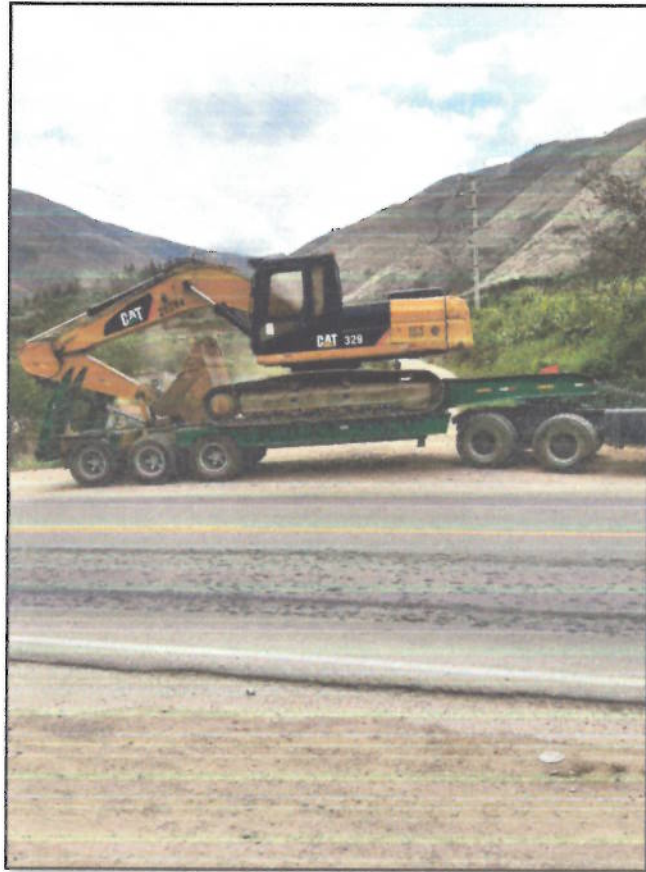

Fotografía N° 10: Transporte de maquinaria pesada con Camión de cama baja.



Fotografía N° 11: Transporte de maquinaria pesada con Camión de cama baja

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY Nº 30450
FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS
DECRETOS SUPLENTE Nº 113-2019-EP
CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
(Artículo Nº 13, numeral 13.1 y 13.2)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL Nº 001

NOMBRE DEL PLEGO SOLICITANTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA

CODIGO DEL PLEGO

100208

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA

CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA

300902

DECRETO SUPLENTE QUE AUTORIZA LOS RECURSOS

FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPLENTE

21/08/2019

MONTO TOTAL AUTORIZADO EN US\$

187,648.00

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES

FECHA DEL REPORTE

18/12/2019

TIPO DE INTERVENCIONES

"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA "MAGAPASH"

Nº DE INTERVENCIONES

1

Nº de Tipo de Intervención (C)

Nº	INFORMACION GENERAL DE LA INTERVENCIÓN							DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO										Avances Fisico			Avance %	Avance \$	Mira física ejecutada mensual	Mira física ejecutada acumulada	Avance %									
	DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN				Ubicación			Monto de la Intervención \$	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Monto de la Incorporación	Avance Financiero				Mira Física prevista mensual	Mira Física ejecutada acumulada	Avance \$																	
	Región	Provincia	Distrito	Localidad	Piensa de Ejecución (en días calendario)	Nº de Resolución de Incorporación de recursos	Comprobado				Devengado	Unidad de medida (UM)	Unidad de medida (UM)																					
1	Limpieza y Descolmatación de la Quebrada "Magapash"				HUANCO	AMBO	TOMAY KICHWA	MAGAPASH	20	26800	043-2019-MD/TA	11/03/2019	26800	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	26800	0.14	26800	100%	100%	100					
2	Limpieza y Descolmatación de la Quebrada "Magapash"				HUANCO	AMBO	TOMAY KICHWA	MAGAPASH	20	32000	043-2019-MD/TA	11/03/2019	32000	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	32000	0.17	32000	100%	100%	100					
3	Limpieza y Descolmatación de la Quebrada "Magapash"				HUANCO	AMBO	TOMAY KICHWA	MAGAPASH	20	29500	043-2019-MD/TA	11/03/2019	29500	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	29500	0.16	29500	100%	100%	100					
4	Limpieza y Descolmatación de la Quebrada "Magapash"				HUANCO	AMBO	TOMAY KICHWA	MAGAPASH	25	32500	043-2019-MD/TA	11/03/2019	32500	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	32500	0.17	32500	100%	100%	100					
5	Limpieza y Descolmatación de la Quebrada "Magapash"				HUANCO	AMBO	TOMAY KICHWA	MAGAPASH	25	8424	043-2019-MD/TA	11/03/2019	8424	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	00.3	00.6	8424	0.04	8424	100%	100%	100					
TOTAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Intervenciones	Nº (C)
Mejora y Capacidad de Respuesta	1
Pliego 1: mermas, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

Firma y Sello
Nombre
Cargo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA
OPERA DE
INFRAESTRUCTURA
- AMB 0 -

Firma y Sello
Nombre
Cargo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA
AJUSTAMENTO
Y PRESUPUESTO
Fecha del área de ejecución del Pliego/Unidad Ejecutora

Firma y Sello
Nombre
Cargo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA
GERENTE MUNICIPAL
AUT. ROSMAR M. CALIXTO LASTRA
GERENTE MUNICIPAL
