



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO
CREADO POR LEY N° 13415

"Año de la Universalización de la Salud"

San Juan Bautista, 15 de enero del 2020

OFICIO N° 015-2020-MDSJB-HGA-AYAC/ALC.

SEÑOR:

Ing. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA

Secretario de la Comisión Multisectorial - FONDES

LIMA.-



ASUNTO : Remito informe de seguimiento de las intervenciones financieras con recursos del FONDES correspondiente al mes de diciembre del 2019

REF : 1) INFORME N°004-2020-MDSJB-OPP/APQ

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente a nombre de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, que honrosamente represento; y a su vez manifestarle que según el DECRETO SUPREMO N°188-2018-EF donde se autoriza crédito suplementario en el sector público para el año fiscal 2018 a favor de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, priorizando en el Acta N°08 de la comisión multisectorial FONDES, de la Obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO", con código SNIP 233877, Código Único 2180296; por lo que en esta oportunidad y en atención al documento de referencia 1) remito al presente el informe de seguimiento de las intervenciones financieras correspondiente al mes de diciembre del 2019 según formato preestablecido por la Secretaria Técnica del FONDES.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



[Firma manuscrita]
Prof. CAYO JUAN DURAND MITMA
Alcalde (e)

C.C
Archivo
MLPP/vra



San Juan Bautista
Un distrito con más oportunidades...
GESTIÓN 2019 - 2022



Jr. España N° 119/ Jr. Mariano Bellido N° 22
www.munisanjuanbautista.gob.pe
Telefono y fax: 066-31354

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

INFORME N° 004 – 2020 - MDSJB-GPP/APO



Al: **ING. JORGE LUÍS CHÁVEZ CRESTA**
Secretario General de la comisión multisectorial

De: **CPCC. AYDA PEREZ ORTEGA**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Asunto: Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de Diciembre del 2019.

Referencia: Decreto Supremo N° 188-2018-EF, de fecha 20 de agosto de 2018.

Fecha: Ayacucho 14 de Enero del 2020.

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del **FONDES** autorizados mediante el Decreto Supremo N° 188-2018-EF, de fecha 20 de agosto de 2018, que detallo a continuación:

I. INFORMACIÓN GENERAL:

- a) **Código y Nombre del Pliego:** 050110 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
- b) **Código y Nombre de la Unidad Ejecutora:** 050110 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
- c) **Tipo de Intervención:** MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
- d) **Monto transferido S/.** 21, 064,411.01
- e) **Dispositivo:** Decreto Supremo N° 188-2018-EF, de fecha 20 de agosto de 2018
- f) Metas previstas de la intervención (mensual).

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

- a) De la ejecución financiera:
 - Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto (Cero).
 - Comentarios sobre la ejecución financiera:
Que mediante el INFORME N° 082-2019-MDSJB/GPP-APO, de fecha 24 de mayo del 2019, la CPCC Ayda Perez Ortega-Gerente de Planeamiento y presupuesto; Informa la Transferencia recibida por S/. 21, 064,411.01. con RUBRO CANON SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE DUANAS Y PARTICIPACIONES, tipo de recurso 23, el mismo que es para la ejecución del proyecto denominado "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA – AYACUCHO".

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Ayda Perez Ortega
CPCC. Ayda Perez Ortega
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

b) De la Ejecución Física:

- Avance físico Mensual y acumulado por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto. (Cero)
- Problemas o dificultades durante la ejecución física de las intervenciones.
- Proceso de Licitación Pública Declarado Nulidad de Oficio y retrotraído hasta Actuaciones preparatorias.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Que solo se recibió vía sistema la comunicación e incorporación vía acto resolutivo el presupuesto que mediante Transferencia recibida por S/. 21, 064,411.01. con RUBRO CANON SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE DUANAS Y PARTICIPACIONES, tipo de recurso 23, el mismo que es para la ejecución del proyecto denominado "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA – AYACUCHO".
- Se tiene un avance de 36.94 % pues se viene realizando los trabajos, de la construcción de la caja principal así como del techado del canal con los respectivos amarres de fierros, para el cual se cuenta con todo el personal técnico y administrativo de la ejecución de la Obra y de la Supervisión de la Obra.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

CPCC Ayda Pérez Ortega
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

Alto de la Tercera contra la Corrupción y la Impunidad

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

ANEXO 5 - CONTENIDO MÍNIMO

INFORME MENSUAL DICIEMBRE

DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES (Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)

- I. **CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE:**
00110 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
- II. **CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA**
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
- III. **NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN**
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO"
- IV. **UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN**
 - Departamento : Ayacucho.
 - Provincia : Huamanga
 - Distrito : San Juan Bautista
 - Localidad : San Juan Bautista
 - Coordenadas UTM de la intervención :
Punto de Inicio: 585000.04, 8544374.77.
Punto de Final: 585349.83, 8543137.81.
- V. **ANTECEDENTES**
 - Con Decreto Supremo, D.S. 188-2018-EF, Autorizan crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 a favor de diversos gobiernos Locales. Entre ellos la Municipalidad distrital de San Juan Bautista, bajo Recursos determinados
 - **Resolución de Alcaldía N° 336-2018**, se incorpora el presupuesto, con Fecha 21 de agosto del 2018, por un Monto de S/. 21, 725,922.00 soles.
 - **Resolución de Alcaldía 138-2019-MDSJB/ALC**, se incorpora el presupuesto, con Fecha 24 de mayo del 2019, por un Monto de S/. 21, 064,411.01 soles.
- VI. **DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN**
 - Que mediante el **INFORME N° 082-2019-MDSJB/GPP-APO**, de fecha 24 de mayo del 2019, la CPCC Ayda Perez Ortega-Gerente de Planeamiento y presupuesto; Informa la Transferencia recibida por S/. 21, 064,411.01, con RUBRO CANON SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE DÚANAS Y PARTICIPACIONES, tipo de recurso 23, el mismo que es para la ejecución del proyecto denominado "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA – AYACUCHO"

- Por lo que el avance físico es (36.94%)
- Precisar las Coordenadas UTM de la intervención ejecutada.
Punto de Inicio: 585000.04, 8544374.77,
Punto de Final: 585349.83, 8543137.81.

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

Población Beneficiaria es de 4,225 habitantes

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

- Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas
Se viene Ejecutando el Expediente técnico de acuerdo al Cronograma de Ejecución, puesto que se está dando inicio a los requerimientos del personal técnico administrativo tanto de la ejecución de la obra y de la supervisión de la Obra.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	METAS FÍSICAS			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO"		0	0	0
ADJUNTO FORMATO DE REFERENCIA				

- Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas
No se ha Ejecutado Ningún Gasto Financiero.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	METAS FINANCIERAS		
	MONTO PROGRAMADO (1)	MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) - (2)
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO"	5,439,759.77	3,856,557.22	10,862,609.32
TOTAL S/	5,439,759.77	3,856,557.22	10,862,609.32

JR. España N° 119/ JR. MARIANO BELLIDO N° 214

Telefono : (066) 313558



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

"Alio de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

IX. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- Fecha de inicio de ejecución física: 03 de Junio del 2019
- Fecha de término de la ejecución física: 28 de Marzo del 2020

X. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

De ser el caso en el rubro correspondiente:

- **En la incorporación**, se logró Incorporar bajo acto resolutive **Resolución de Alcaldía 138-2019-MDSJB/ALC**, se incorpora el presupuesto, con Fecha 24 de mayo del 2019, por un Monto de S/. 21, 064,411.01 soles.
- Los Procedimiento en adquisiciones tanto de los bienes y servicios tiene sus propios procedimientos.
- **En la ejecución física**: Se tiene un avance de 36.94 %.
- **En la ejecución financiera**: Se tiene un avance de 37.89 %.

XI. CONCLUSIONES

- Que solo se recibió vía sistema la comunicación e incorporación vía acto resolutive el presupuesto que mediante Transferencia recibida por S/. 21, 064,411.01. con RUBRO CANON SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE DUANAS Y PARTICIPACIONES, tipo de recurso 23, el mismo que es para la ejecución del proyecto denominado "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA – AYACUCHO"
- *Se tiene un avance de 36.94 %, ya que se encuentra en plena ejecución con todo el personal técnico y administrativo de la ejecución de la Obra y de la Supervisión de la Obra.*

XII. RECOMENDACIONES

Se recomienda lo siguiente:

- Continuar con todos los avances programados de acuerdo a Expediente Técnico con todo el personal técnico administrativo para la ejecución de las mismas, con la respectiva Supervisión de la Obra.
- Continuar con la Supervisión del Expediente Técnico para la ejecución Física de obra, bajo el cronograma de ejecución valorizado y de acuerdo a todas las normas Ejecutivas técnicas vigentes.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30459
 FONDO PARA INTERVENIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS
 DECRETO SUPLENTO N° 132-2017-EF
 CONFORMACION Y FUNCIONES DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
 (Artículo N° 13, numerales 13.1 y 13.3)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 14

NOMBRE DEL PLEGO SOLICITANTE: **Municipalidad Distrital de San Juan Bautista**
 CODIGO DEL PLEGO: **50110**
 NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **Municipalidad Distrital de San Juan Bautista**
 CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA:
 DECRETO SUPLENTO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS: **D.S. N° 188-2018-EF**
 FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPLENTO: **20/08/2018**
 REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES: **dic-19**
 FECHA DEL REPORTE: **14/01/2020**
 TIPO DE INTERVENIONES: **Mitigación y Capacidad de Respuesta**
 Nº DE INTERVENIONES: **1**
 MONTO TOTAL AUTORIZADO S/ (*): **21,064,411.01**

N°	DENOMINACION DE LA INTERVENION	INFORMACION GENERAL DE LA INTERVENION				Monto de la Incorporación	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	N° de Resolución de Incorporación de recursos	Monto de la Intervención S/	Plazo de Ejecución (en días calendario)	Ubicación	DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO										
		Certificado			Compromiso							Devengado		Avance Fisico								
		Region	Provincia	Distrito	Localidad							GG3	GG6	GG3	GG6	Total	GG3	GG6	Total	Avance % (GG3)		
1	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAGURUYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	Ayacucho	Huamanga	San Juan Bautista	San Juan Bautista	300	21064411 01	RA N° 138-2019-MDSJ/B/ALC	27/05/2019	1,581,977.61	2,913,227.03	3,796,173.12	7,980,414.06	21064411 01	7782200 60	7782200 60	21064411 01	0	0	37.89	36.94	
2	TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00									

Tipo de Intervenciones	N° (*)
Mitigación y Capacidad de Respuesta	1
Peligro Inminente, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

Firma y Sello
 Nombre
 Cargo

Firma y Sello
 Nombre
 Cargo

Firma y Sello
 Nombre
 Cargo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 Lic. Maria Luz Palomino Prado
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 CPCC. Ayda Pérez Ortega
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 GERENCIA DE INERVENIONES PUBLICAS
 Ing. Alberto Malva Orellana
 REGISTRO CIP 771710


VALORIZACIONES MENSUAL N° 07

MES DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA: FUNDACIONES Y ACOMODAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHACHUHUAYCCO DISTRITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRACION DIRECTA
 MODALIDAD EJECUCION: INC. WILFREDO FARFAN CARDENAS
 RESIDENTE DE OBRA: ING. ISMAC W. ALTAMIRANO SIBEROS
 SUPERVISOR DE OBRA: ING. ISMAC W. ALTAMIRANO SIBEROS

DISTRITO: SAN JUAN BAUTISTA
 PROVINCIA: HUAMANGA
 DEPARTAMENTO: AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCION	Und.	PRESUPUESTO			AVANCES ACUMULADO			SALDO		
			Metrado	P.Uni/LS	Presupuesto	Metrado	Val. S/.	%	Metrado	Val. S/.	%
01.01.01	OBRA PROVISIONALES	MES	9.00	750.00	6.300.00	6.00	4.200.00	66.67%	3.00	2.100.00	33.33%
01.01.02	ALQUILER DE OFICINA	UND	1.00	2.707.58	2.707.58	1.00	2.707.58	100.00%	-	-	0.00%
01.01.03	CARTEL DE OBRA (INC. INSTALACION)	m2	1.000.00	117.32	117.320.00	647.20	75.928.56	64.72%	352.80	41.391.44	35.28%
01.01.04	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y CAMPAMENTO DE OBRA	UND	4.00	50.00	200.00	4.00	200.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.05	PARANTES PARA SEÑALIZACIONES	UND	4.00	120.00	480.00	4.00	480.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.06	TRANQUERA DE MADERA 1.20 X 1.10M PRENSIVO TRANSITO VEHICULAR	UND	8.00	555.00	4.440.00	8.00	4.440.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.07	PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE LA OBRA)	UND	10.00	555.00	5.550.00	5.00	2.775.00	50.00%	5.00	2.775.00	50.00%
01.02	TRABAJO PRELIMINARES	UND	1.00	5.930.00	5.930.00	0.65	3.853.50	65.00%	0.35	2.076.50	35.00%
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	GLB	1.57	634.25	742.44	1.17	742.34	100.00%	-	-	0.00%
01.02.02	LIMPIEZA Y DESFORESTACION	m2	11.700.00	2.77	32.409.00	11.700.00	32.409.00	100.00%	-	-	0.00%
01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m2	11.700.00	3.96	46.332.00	11.700.00	46.332.00	100.00%	-	-	0.00%
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	366.83	39.01	14.318.31	366.83	14.318.31	100.00%	-	-	0.00%
01.02.05	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	m3	1.170.00	1.12	1.310.40	1.170.00	1.310.40	100.00%	-	-	0.00%
01.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	CAE	3.00	8.000.00	24.000.00	2.19	17.200.00	71.67%	0.85	6.800.00	28.33%
01.03.01	SEÑALIZACION PARA LIMITE DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2.350.00	2.350.00	1.00	2.350.00	100.00%	-	-	0.00%
01.03.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	CAE	1.00	2.350.00	2.350.00	1.00	2.350.00	100.00%	-	-	0.00%
01.03.03	RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	CAE	1.00	2.350.00	2.350.00	1.00	2.350.00	100.00%	-	-	0.00%
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS	GLB	32.571.37	5.76	284.897.20	-	-	0.00%	32.571.37	284.897.20	100.00%
01.04.01	EXCAVACION MAQUINARIA MAT. SUELTO	m3	1.000.74	28.63	51.726.97	-	-	0.00%	1.000.74	51.726.97	100.00%
01.04.02	EXCAVACION MAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m3	1.006.74	96.48	179.597.54	17.00	1.623.16	0.94%	1.786.74	170.854.38	99.06%
01.04.03	EXCAVACION MAQUINARIA EN ROCA FIJA	m3	26.451.89	63.29	1.673.967.94	4.105.38	269.768.45	15.82%	22.346.51	1.414.074.59	84.18%
01.04.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	46.642.87	21.57	1.006.066.71	29.268.50	631.320.65	62.76%	17.374.37	374.766.16	37.24%
01.04.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE MAQUINARIA	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	OBRA DE CONCRETO ARMADO	GLB	327.60	480.13	157.280.59	-	-	0.00%	327.60	157.280.59	100.00%
01.05.01	ZAPATAS	m3	1.965.60	535.97	1.053.502.63	-	-	0.00%	1.965.60	1.053.502.63	100.00%
01.05.01.01	SOLADO FC-210 KGCM2	m3	2.808.00	73.98	207.735.84	-	-	0.00%	2.808.00	207.735.84	100.00%
01.05.01.02	CONCRETO FC-210 KGCM2 EN ZAPATAS	m3	130.719.02	5.50	719.673.63	-	-	0.00%	130.719.02	719.673.63	100.00%
01.05.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	683.40	22.84	15.608.85	683.40	15.608.85	100.00%	-	-	0.00%
01.05.01.04	ACERO CORRUGADO N°4200 Kg/cm2 GRADO 60 PIZAPATAS	kg	583.40	16.33	9.511.59	-	-	0.00%	583.40	9.511.59	100.00%
01.05.01.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	5.071.95	0.85	4.311.16	-	-	0.00%	5.071.95	4.311.16	100.00%
01.05.01.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	5.071.95	0.85	4.311.16	-	-	0.00%	5.071.95	4.311.16	100.00%
01.05.01.07	CURADO DE CONCRETO	m2	5.071.95	0.85	4.311.16	-	-	0.00%	5.071.95	4.311.16	100.00%
01.05.02	BOVEDA	m3	7.343.62	994.27	4.384.093.06	-	-	0.00%	7.343.62	4.384.093.06	100.00%
01.05.02.01	CONCRETO PARA BOVEDA FC-210 KGCM2	m3	12.343.50	82.44	1.017.598.14	-	-	0.00%	12.343.50	1.017.598.14	100.00%
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BOVEDA	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-




VALORIZACIONES MENSUAL N° 07

MES DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA : INUNDACIONES Y ACCIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYOCO DISTRITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 UNIDAD EJECUTORA : ADMINISTRACION DIRECTA
 MODALIDAD EJECUCION : INC. WILFREDO FARFAN CARDENAS
 RESIDENTE DE OBRA : INC. ISAAC W. ALFARANO BISEROS
 SUPERVISOR DE OBRA : INC. ISAAC W. ALFARANO BISEROS

DISTRITO : SAN JUAN BAUTISTA
 PROVINCIA : HUAYANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCION	Und.	PRESUPUESTO			AVANCES			SALDO		
			Metrado	P. Unit/Sr	Presupuesto	Metrado	Val. Sr.	%	Metrado	Val. Sr.	%
01.05.02.03	ACERO CORRUGADO 4x4200 kg/cm2 GRADO 60 PROVEDA	kg	317,151.85	6.96	2,051,432.03	0.00%	317,151.85	2,051,432.03	100.00%		
01.05.02.04	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	693.40	22.84	15,698.56	100.00%	693.40	15,698.56	100.00%		
01.05.02.05	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	693.40	16.33	11,159.92	0.00%	693.40	11,159.92	100.00%		
01.05.02.06	LLORADORES	UND	288.00	24.42	6,544.56	100.00%	288.00	6,544.56	100.00%		
01.05.02.07	CURADO DE CONCRETO	m2	12,343.50	0.95	10,891.99	75.46%	9,314.80	2,577.40	24.54%		
01.06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					0.00%	598.20	212,766.61	100.00%		
01.06.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 - 30% PM	m3	598.20	398.33	212,766.61	0.00%	598.20	212,766.61	100.00%		
02	TRANSFERENCIA DE LOS TRABAJOS EN PROYECTO A OBRAS EJECUTIVAS										
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES										
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m2	210.70	2.77	583.64	0.00%	210.70	583.64	100.00%		
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	210.70	3.96	834.37	0.00%	210.70	834.37	100.00%		
02.01.03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	m3	63.21	33.01	2,032.61	0.00%	63.21	2,032.61	100.00%		
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
02.02.01	EXCAVACION OMAQUINARIA MAT. SUELTO	m3	548.12	8.75	4,781.29	0.00%	548.12	4,781.29	100.00%		
02.02.02	EXCAVACION OMAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m3	30.51	29.83	907.50	0.00%	30.51	907.50	100.00%		
02.02.03	EXCAVACION OMAQUINARIA EN ROCA FIJA	m3	30.51	95.46	2,913.09	0.00%	30.51	2,913.09	100.00%		
02.02.04	RELLENDO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	610.14	63.28	38,598.66	0.00%	610.14	38,598.66	100.00%		
02.02.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE OMAQUINA	m3	879.06	21.52	18,914.32	0.00%	879.06	18,914.32	100.00%		
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN CAJAS DE RECEPCION ZAPATAS										
02.03.01	SOLADO FC=210 KG/CM2	m3	2.75	490.13	1,328.36	0.00%	2.75	1,328.36	100.00%		
02.03.01.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	43.08	535.97	23,084.45	0.00%	43.08	23,084.45	100.00%		
02.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	17.82	73.99	1,318.32	0.00%	17.82	1,318.32	100.00%		
02.03.01.04	ACERO CORRUGADO 4x4200 kg/cm2 GRADO 60 PIZAPATAS	kg	743.05	6.50	4,828.83	0.00%	743.05	4,828.83	100.00%		
02.03.01.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	13.63	22.84	310.62	0.00%	13.63	310.62	100.00%		
02.03.01.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	13.60	16.33	222.09	0.00%	13.60	222.09	100.00%		
02.03.01.07	CURADO DE CONCRETO	m2	27.54	0.86	23.41	0.00%	27.54	23.41	100.00%		
02.03.02	MURO										
02.03.02.01	CONCRETO PARA MUROS FC=210 KG/CM2	m3	12.07	556.65	6,718.77	0.00%	12.07	6,718.77	100.00%		
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	55.89	79.57	4,442.17	0.00%	55.89	4,442.17	100.00%		
02.03.02.03	ACERO CORRUGADO 4x4200 kg/cm2 GRADO 60 PARMUROS	kg	1,890.50	6.50	12,093.25	0.00%	1,890.50	12,093.25	100.00%		
02.03.02.04	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	6.90	22.84	157.69	0.00%	6.90	157.69	100.00%		
02.03.02.05	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	6.90	16.33	112.68	0.00%	6.90	112.68	100.00%		
02.03.02.06	LLORADORES	UND	4.00	24.42	97.68	0.00%	4.00	97.68	100.00%		
02.03.02.07	CURADO DE CONCRETO	m2	27.95	0.85	23.75	0.00%	27.95	23.75	100.00%		
02.03.03	LOSA										




VALORIZACIONES MENSUAL N° 07

MES DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA : FUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIRUAJUNCO DISTRITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 UNIDAD EJECUTORA : ADMINISTRACION DIRECTA
 MODALIDAD DE EJECUCION : ING. WILFREDO FARRAN CARDENAS
 RESIDENTE DE OBRA : ING. ISAAC W. ALTAMIRANO BIBEROS
 SUPERVISOR DE OBRA :

DISTRITO : SAN JUAN BAUTISTA
 PROVINCIA : HUAMANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCION	Und.	PRESUPUESTO			AVANCES ACUMULADO			SALDO		
			Metrado	P.Uni.S/	Presupuestado	Metrado	Val.S/	%	Metrado	Val.S/	%
02.03.03.01	CONCRETO PARA LOSA FC=210 KG/CM2	m3	15.59	584.27	9,264.67	-	-	15.59	9,264.67	100.00%	
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS	m2	25.11	86.38	2,169.30	-	-	25.11	2,169.30	100.00%	
02.03.03.03	ACERO CORRUGADO 4x4200 kg/cm2 GRADO 60 P/LOSAS	kg	634.54	6.50	4,124.51	-	-	634.54	4,124.51	100.00%	
02.03.03.04	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	11.00	22.84	251.24	-	-	11.00	251.24	100.00%	
02.03.03.05	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	11.00	15.33	168.63	-	-	11.00	168.63	100.00%	
02.03.03.06	CURADO DE CONCRETO	m2	44.55	0.85	37.87	-	-	44.55	37.87	100.00%	
02.03.04	MUROS LATERALES DE CONCRETO ARMADO EN ALIVIADERO										
02.03.04.01	SOLADO FC=210 KG/CM2	m3	7.48	486.13	3,618.77	-	-	7.48	3,618.77	100.00%	
02.03.04.02	CONCRETO PARA MUROS FC=210 KG/CM2	m3	61.75	556.65	34,373.14	-	-	61.75	34,373.14	100.00%	
02.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	141.36	79.57	11,246.02	-	-	141.36	11,246.02	100.00%	
02.03.04.04	ACERO CORRUGADO 4x4200 kg/cm2 GRADO 60 P/MUROS	kg	4,281.17	6.50	27,827.61	-	-	4,281.17	27,827.61	100.00%	
02.03.04.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	15.62	22.84	359.76	-	-	15.62	359.76	100.00%	
02.03.04.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	23.27	16.33	379.18	-	-	23.27	379.18	100.00%	
02.03.04.07	CURADO DE CONCRETO	m2	213.55	0.85	181.56	-	-	213.55	181.56	100.00%	
02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN ALIVIADERO										
02.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 + 30% PM	m3	35.21	395.33	14,314.93	-	-	35.21	14,314.93	100.00%	
02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS	m2	83.70	73.98	6,192.13	-	-	83.70	6,192.13	100.00%	
02.04.03	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	12.00	22.84	274.08	-	-	12.00	274.08	100.00%	
02.04.04	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	12.00	16.33	195.96	-	-	12.00	195.96	100.00%	
02.04.05	CURADO DE CONCRETO	m2	38.70	0.85	32.90	-	-	38.70	32.90	100.00%	
03	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPL. DE CASAL PREPARADO A LOS BRILLOS EXISTENTES										
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES										
03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m2	2,400.00	2.77	6,648.00	2,400.00	6,648.00	2,400.00	6,648.00	100.00%	
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	2,400.00	3.86	9,264.00	1,200.00	4,632.00	1,200.00	4,632.00	50.00%	
03.01.03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	m3	78.06	38.01	2,967.06	-	-	78.06	2,967.06	100.00%	
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
03.02.01	EXCAVACION CMAQUINARIA MAT. SUELTO	m3	3,312.75	8.76	29,019.69	-	-	3,312.75	29,019.69	100.00%	
03.02.02	EXCAVACION CMAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m3	461.81	23.63	10,912.62	-	-	461.81	10,912.62	100.00%	
03.02.03	EXCAVACION CMAQUINARIA EN ROCA FIJA	m3	461.81	96.48	44,603.62	-	-	461.81	44,603.62	100.00%	
03.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	6,257.21	63.28	395,956.25	-	-	6,257.21	395,956.25	100.00%	
03.02.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CMAQUINARIA	m3	13,875.48	21.57	298,154.10	-	-	13,875.48	298,154.10	100.00%	
03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO										
03.03.01	ZAPATAS										
03.03.01.01	SOLADO FC=210 KG/CM2	m3	123.81	480.13	59,444.90	73.10	35,097.50	50.71	24,347.39	40.96%	
03.03.01.02	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	784.38	535.97	420,404.15	27.89	14,935.06	3.59%	405,566.56	96.47%	
03.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	616.44	73.98	45,604.23	61.82	4,573.44	10.03%	41,030.79	89.97%	




VALORIZACIONES MENSUAL N° 07

MES DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA : INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAJIQUAYCCO DISTRITO
 UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 MODALIDAD EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
 RESIDENTE DE OBRA : ING. WILFREDO FARFAN CARDENAS
 SUPERVISOR DE OBRA : ING. ISAAC W. ALTIMIRANO BIBEROS

DISTRITO : SAN JUAN BAUTISTA
 PROVINCIA : HUAMANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCION	Und.	PRESUPUESTO			AVANCES ACUMULADO			SALDO		
			Metrado	P. Uni./SI	Presupuesto	Metrado	Val. SI.	%	Metrado	Val. SI.	%
03.03.01.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60 PIZAPATAS	kg	48,319.87	6.50	314,079.16	2,920.15	18,980.98	6.04%	45,399.72	285,086.18	93.96%
03.03.01.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	286.67	22.84	6,547.54	19.00	433.96	6.63%	267.67	6,113.58	93.37%
03.03.01.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	292.09	16.33	4,769.83	-	-	0.00%	292.09	4,769.83	100.00%
03.03.01.07	CURADO DE CONCRETO	m ²	1,411.45	0.85	1,199.73	92.25	78.41	6.54%	1,319.20	1,121.32	93.46%
03.03.02	MURO										
03.03.02.01	CONCRETO PARA MUROS F'C=210 KG/CM ²	m ³	1,051.39	556.65	585,256.24	63.00	35,068.95	5.99%	988.39	550,187.29	94.01%
03.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m ²	3,925.59	79.57	312,359.20	84.00	6,683.88	2.14%	3,841.59	305,675.32	97.86%
03.03.02.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60 PIMUROS	kg	97,795.64	6.50	635,671.66	8,030.60	52,198.90	8.21%	89,765.04	583,472.76	91.79%
03.03.02.04	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	844.82	22.84	19,295.69	39.50	902.18	4.68%	805.32	18,393.51	95.32%
03.03.02.05	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	844.82	16.33	13,795.91	-	-	0.00%	844.82	13,795.91	100.00%
03.03.02.06	LLORADORES	UND	544.00	24.42	13,284.48	9.00	219.78	1.65%	535.00	13,064.70	98.35%
03.03.02.07	CURADO DE CONCRETO	m ²	3,925.59	0.85	3,336.75	65.70	55.85	1.67%	3,859.89	3,280.91	98.33%
03.03.03	LOSA										
03.03.03.01	CONCRETO PARA LOSA F'C=210 KG/CM ²	m ³	594.27	594.27	211,940.45	-	-	0.00%	356.64	211,940.45	100.00%
03.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS	m ²	731.24	86.38	63,164.51	-	-	0.00%	731.24	63,164.51	100.00%
03.03.03.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60 PILOSAS	kg	41,936.87	6.50	272,589.66	-	-	0.00%	41,936.87	272,589.66	100.00%
03.03.03.04	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	139.28	22.84	3,181.16	-	-	0.00%	139.28	3,181.16	100.00%
03.03.03.05	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	139.28	16.33	2,274.44	-	-	0.00%	139.28	2,274.44	100.00%
03.03.03.06	CURADO DE CONCRETO	m ²	731.50	0.85	621.78	-	-	0.00%	731.50	621.78	100.00%
03.03.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE										
03.03.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM ² +30% PM.	m ³	82.70	395.33	32,693.79	-	-	0.00%	82.70	32,693.79	100.00%
04	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ENTREGA DE AGUA PLUVIAL A LA QUEBRADA										
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES										
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m ²	225.41	2.77	624.39	-	-	0.00%	225.41	624.39	100.00%
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m ²	225.41	3.96	892.62	-	-	0.00%	225.41	892.62	100.00%
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
04.02.01	EXCAVACION CIMAQUINARIA MAT. SUELTO	m ³	202.87	8.76	1,777.14	-	-	0.00%	202.87	1,777.14	100.00%
04.02.02	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m ³	11.27	28.63	322.66	-	-	0.00%	11.27	322.66	100.00%
04.02.03	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA FIJA	m ³	11.27	95.48	1,076.06	-	-	0.00%	11.27	1,076.06	100.00%
04.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m ³	56.35	63.28	3,565.83	-	-	0.00%	56.35	3,565.83	100.00%
04.02.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CIMAQUINA	m ³	354.46	21.57	7,645.70	-	-	0.00%	354.46	7,645.70	100.00%
04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE										
04.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM ²	m ³	55.52	502.46	27,896.58	-	-	0.00%	55.52	27,896.58	100.00%
04.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM ² +30% PM.	m ³	54.05	395.33	21,367.59	-	-	0.00%	54.05	21,367.59	100.00%
04.03.03	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	54.00	16.33	881.82	-	-	0.00%	54.00	881.82	100.00%
04.03.04	CURADO DE CONCRETO	m ²	225.41	0.85	191.60	-	-	0.00%	225.41	191.60	100.00%



VALORIZACIONES MENSUAL N° 07

MES DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA: OBRAS PRELIMINARES DE ALICANTARILLA DE ANCHO DE 1.20 M. PARA LA ESCUELA CAYAL PROYECTADO
 MUNICIPIALIDAD DISTRITAL DE CHACHIBAY
 DISTRITO: CHACHIBAY
 PROVINCIA: HUAYANESA
 DEPARTAMENTO: AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 RESIDENTE DE OBRA: ING. WILFREDO FARFAN CARDENAS
 SUPERVISOR DE OBRA: ING. ISAAC W. ALFAMIRANO BIBEROS

ITEM	DESCRIPCION	Und.	PRESUPUESTO			AVANZOS			SALDO	
			Metrado	P. Unit \$/	Presupuestado	Metrado	Val. \$/	%	Metrado	Val. \$/
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	256.48	2.77	710.45	256.48	710.45	100.00%	710.45	100.00%
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m2	315.55	3.96	1,249.62	315.55	1,249.62	100.00%	1,249.62	100.00%
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	475.18	41.96	19,953.44	475.18	19,953.44	100.00%	19,953.44	100.00%
05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	325.22	3.54	1,151.28	325.22	1,151.28	100.00%	1,151.28	100.00%
05.02.02	NIVELACION Y PERFLADO EN FONDO DE ZANJA	m3	87.30	75.19	6,572.96	87.30	6,572.96	100.00%	6,572.96	100.00%
05.02.03	COMPACTADO CAMA DE APOYO CMATERIAL SELECCIONADO	m3	192.28	63.28	12,167.48	192.28	12,167.48	100.00%	12,167.48	100.00%
05.02.04	RELLENO COMPACTADO LATERAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	593.99	16.35	9,729.39	593.99	9,729.39	100.00%	9,729.39	100.00%
05.02.05	ACABAR DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	593.99	21.57	12,812.16	593.99	12,812.16	100.00%	12,812.16	100.00%
05.02.06	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	32.51	458.13	15,609.03	32.51	15,609.03	100.00%	15,609.03	100.00%
05.03	ALICANTARILLA DE CONCRETO ARMADO	m3	187.67	556.85	104,466.51	187.67	104,466.51	100.00%	104,466.51	100.00%
05.03.01	SOLADO F-C-210 KG/CM2	m2	588.09	79.57	46,794.32	588.09	46,794.32	100.00%	46,794.32	100.00%
05.03.02	CONCRETO EN ALICANTARILLA F-C-210 KG/CM2	m2	10,998.89	6.50	71,286.49	10,998.89	71,286.49	100.00%	71,286.49	100.00%
05.03.03	ENCORFADO Y DESENCORFADO EN ALICANTARILLA	kg	20.06	22.84	458.17	20.06	458.17	100.00%	458.17	100.00%
05.03.04	ACERO CORRUGADO 1/2" x 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ALICANTARILLA	m	20.06	16.33	327.59	20.06	327.59	100.00%	327.59	100.00%
05.03.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m2	588.07	0.85	498.86	588.07	498.86	100.00%	498.86	100.00%
05.03.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m2	77.87	330.30	25,720.46	77.87	25,720.46	100.00%	25,720.46	100.00%
05.03.07	CURADO DE CONCRETO	m3	12.85	395.31	5,079.99	12.85	5,079.99	100.00%	5,079.99	100.00%
05.03.08	REJILLA METALICA	m2	8.53	0.86	7.25	8.53	7.25	100.00%	7.25	100.00%
05.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m3	377.93	2.77	1,046.87	377.93	1,046.87	100.00%	1,046.87	100.00%
05.04.01	CONCRETO F-C-210 KG/CM2 +30% RM	m2	377.93	3.96	1,496.60	377.93	1,496.60	100.00%	1,496.60	100.00%
05.04.02	CURADO DE CONCRETO	m2	2,190.20	8.76	19,186.15	2,190.20	19,186.15	100.00%	19,186.15	100.00%
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m3	121.67	28.83	3,483.41	121.67	3,483.41	100.00%	3,483.41	100.00%
06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m3	121.67	95.48	11,617.05	121.67	11,617.05	100.00%	11,617.05	100.00%
06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m3	1,636.82	63.28	103,577.97	1,636.82	103,577.97	100.00%	103,577.97	100.00%
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	3,102.76	21.57	66,926.53	3,102.76	66,926.53	100.00%	66,926.53	100.00%
06.02.01	EXCAVACION C/MAQUINARIA MAT. SUELTO	m3	34.11	496.13	16,917.31	34.11	16,917.31	100.00%	16,917.31	100.00%
06.02.02	EXCAVACION C/MAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m3	347.84	556.65	193,625.14	347.84	193,625.14	100.00%	193,625.14	100.00%
06.02.03	EXCAVACION C/MAQUINARIA EN ROCA FLUA	m3								
06.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3								
06.02.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/MAQUINA	m3								
06.03	MURO DE CONCRETO ARMADO	m3								
06.03.01	SOLADO F-C-210 KG/CM2	m3								
06.03.02	CONCRETO PARA MUROS F-C-210 KG/CM2	m3								

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
 Ing. Alberto Malaga Oros
 REGISTRADO CP 17910
 GERENTE


VALORIZACIONES MENSUAL N° 07

MES DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA : INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHACHUAYCCO DISTRITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, ADMINISTRACION DIRECTA
 MODALIDAD EJECUCION : ING. WILFREDO FARFAN CARDENAS
 RESIDENTE DE OBRA : ING. ISAAC W. ALTAMIRANO BIBEROS
 SUPERVISOR DE OBRA :

DISTRITO : SAN JUAN BAUTISTA
 PROVINCIA : HUANANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCION	Und:	PRESUPUESTO			AVANCES			SALDO		
			Metrado	P. Unit. S/	Presupuestado	Metrado	Val. S/	%	Metrado	Val. S/	%
06.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m ²	1.135,35	79,57	90.319,60	-	-	1.135,35	90.319,60	100,00%	
06.03.04	ACERO CORRUGADO H=4200 kg/cm ² GRADO 80 FINAJROS	kg	31.609,84	5,86	205.462,01	-	-	31.609,84	205.462,01	100,00%	
06.03.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	64,80	22,84	1.480,03	-	-	64,80	1.480,03	100,00%	
06.03.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	64,80	16,33	1.069,18	-	-	64,80	1.069,18	100,00%	
06.03.07	CURADO DE CONCRETO	m ²	1.478,54	0,85	1.256,76	-	-	1.478,54	1.256,76	100,00%	
06.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m ³	40,16	501,31	20.332,61	-	-	40,16	20.332,61	100,00%	
06.04.01	CONCRETO EN PAVIMENTO FC=210 KG/CM ²	m ²	13,60	73,88	1.003,92	-	-	13,60	1.003,92	100,00%	
06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS	m	60,00	9,19	634,11	-	-	60,00	634,11	100,00%	
06.04.03	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA	m ²	200,80	0,85	179,89	-	-	200,80	176,66	100,00%	
06.04.04	CURADO DE CONCRETO	m	141,07	500,00	70.535,00	-	-	141,07	70.535,00	100,00%	
06.05.01	CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO	UND	2,00	1.600,00	3.200,00	-	-	2,00	3.600,00	100,00%	
06.05.02	CERCA DE PROTECCION CON MALLA OLIMPICA GALVANIZADA H=2,20M	UND	14,00	129,00	1.806,00	10,00	1.206,00	4,00	489,00	26,57%	
07	PUERTA DE INGRESO DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA	UND	5,00	80,00	400,00	6,00	480,00	1,00	80,00	2,00%	
07.01	RECOLECCION DE IMPACTO AMBIENTAL	CAP	1,00	500,00	500,00	-	-	1,00	500,00	100,00%	
07.02	RECIPIENTES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS	m ²	14.100,00	1,03	14.523,00	-	-	14.100,00	14.523,00	100,00%	
07.03	SEÑALIZACION AMBIENTAL	ovt	6,00	1.095,00	6.570,00	2,00	2.190,00	4,00	4.380,00	66,67%	
07.04	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION	ovt	5,00	1.175,00	7.050,00	5,00	5.875,00	1,00	1.175,00	16,67%	
08	CAPACITACION EN CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	ovt	2,00	1.085,00	2.170,00	-	-	2,00	2.180,00	100,00%	
08.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	420,00	150,00	63.000,00	420,00	63.000,00	-	-	0,00%	
08.02	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION	ovt	20,09	20,09	18.553,92	460,78	9.854,86	433,22	8.699,06	46,89%	
08.03	CHARLA EN EDUCACION SANITARIA	UND	5,00	450,00	2.250,00	5,00	2.250,00	1,00	450,00	16,67%	
09	CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	UND	6,00	500,00	3.000,00	5,00	2.500,00	1,00	500,00	16,67%	
09.01	MEASURAS DE PREVENION	UND	6,00	500,00	3.000,00	5,00	2.500,00	1,00	500,00	16,67%	
09	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	UND	924,00	5,00	4.620,00	-	-	924,00	4.620,00	100,00%	
10	RECOLECCION MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA CIRCUNDANTE	UND	5,00	450,00	2.250,00	-	-	5,00	2.250,00	100,00%	
10.01	LETRINAS TEMPORALES	UND	6,00	500,00	3.000,00	-	-	6,00	3.000,00	100,00%	
10.02	LETRINAS MOVILES	UND	6,00	500,00	3.000,00	-	-	6,00	3.000,00	100,00%	
10.03	LETRINAS MOVILES	UND	6,00	500,00	3.000,00	-	-	6,00	3.000,00	100,00%	
COSTO DIRECTO			14.688.912,89			14.688.912,89			17.282.446,08		
GASTOS GENERALES (8,27% CD)			1.312.254,59			1.312.254,59			1.601.489,71		
GASTOS DE SUPERVISION (3,38%CD)			637.793,62			637.793,62			804.859,87		
PRESUPUESTO TOTAL			1.595.536,36			1.595.536,36			19.468.754,66		





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA – AYACUCHO**


"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

**PANEL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES PARA EL PRESENTE
MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

IMAGEN N° 01: Coordinaciones con el Responsable del Proyecto, para realizar el Replanteo de los Planos, acerca de los puntos más críticos en la Obra de Chaquihuaycco.



IMAGEN N° 02: Trabajos de toma de datos en campo para realizar las Valorizaciones Mensuales de Obra.

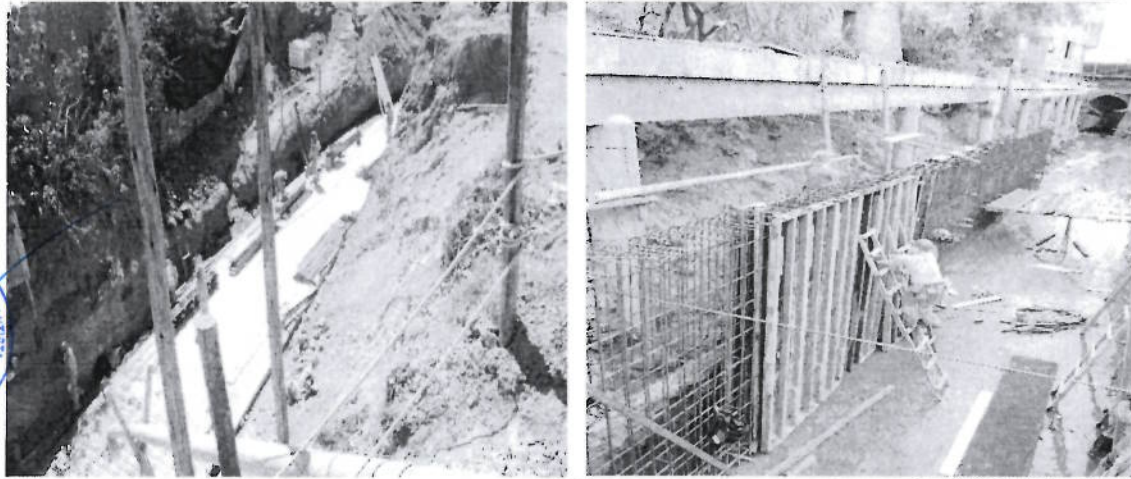



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA – AYACUCHO

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



IMAGEN N° 03: Afianzamiento de la Parte Estructural de la Sección Rectangular, para llevar un adecuado Control del metrado diario en campo de todo el proceso constructivo de la obra del 0+400 al 1+200.



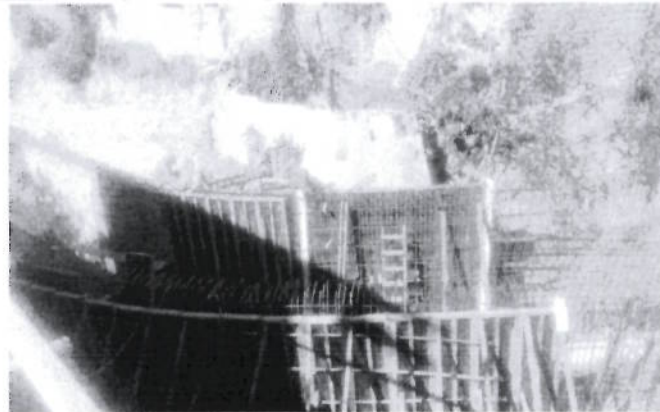


IMAGEN N° 04: Verificación de control de Materiales de Obra en las distintas progresivas del 0+900 al 1+100.

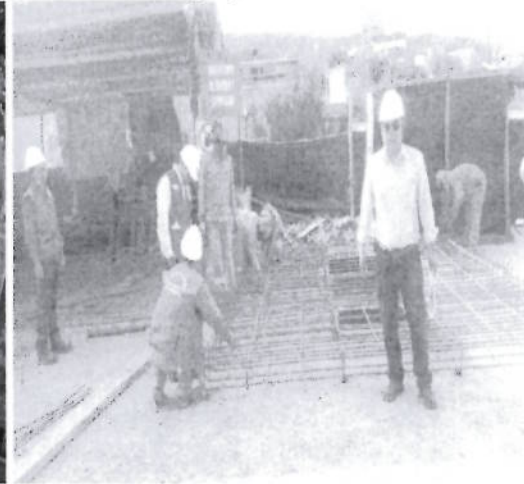

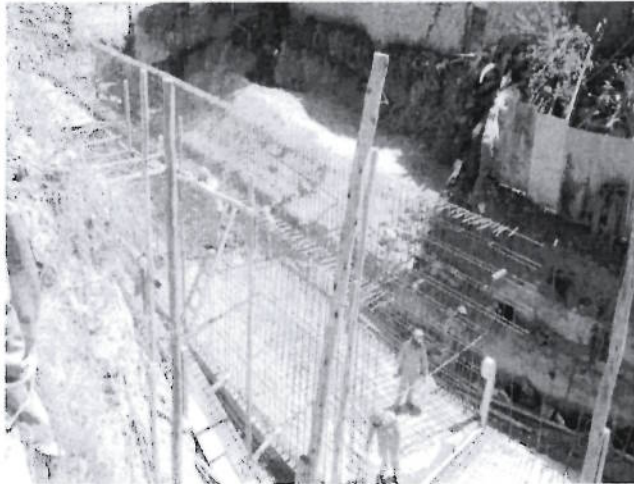

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA – AYACUCHO

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

IMAGEN N° 05: Encofrado de la Sección Rectangular en la progresiva 0+700, verificación del amarre de los paneles y maderas, así como la verificación del metrado diario en Chaquihuaycco.



IMAGEN N° 06: Amarre de los fierros de sección rectangular en la progresiva 0+400.



IMAGEN N° 07: Amarre de los fierros de acuerdo a las especificaciones técnicas en la progresiva 0+450.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA – AYACUCHO

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



IMAGEN N° 08: Verificación de llenado de concreto en las diferentes progresivas en coordinación con los diferentes responsables de obra.



IMAGEN N° 09: Verificación de la parte Estructural, así como el cuidado necesario del doblado de los mismos y el trenzado de acuerdo a las especificaciones técnicas en la progresiva 0+450.

