



Instituto Nacional Defensa Civil
DIRECCION DESCONCENTRADA DE LORETO

"Año de la universalización de la salud"
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



MEMORANDUM N° 038 -2020-INDECI/47.0

A : **Dr. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA**
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES.

Asunto : Remite Informe Final de Intervenciones Financiadas con Recursos del FONDES.

Referencia : Decreto supremo N° 265-2019-EF, del 21 de agosto del 2019.

Anexo : OFICIO N°026-2020-ALC-MDS-B.

Fecha : Iquitos, 28 de enero del 2020.

Es grato dirigirme a usted, para saludarle muy cordialmente y a la vez remitirle adjunto el oficio indicado en el anexo, correspondiente al informe final de intervenciones financiadas con recursos del FONDES:

1.- Copia de Informe final (10 folios)

Sin otro particular me suscribo de usted, no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Ing. ANA CAROLA RÍOS MARTÍNEZ
Directora de la Dirección Desconcentrada de Loreto
Instituto Nacional de Defensa Civil

C.c
-Archivo.
-Of. GRD.

N° OPE. 005358



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
Bagazan - Rio Ucayali
ADMINISTRACION

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Bagazán, 23 de enero de 2020

OFICIO N° 026-2020-ALC-MDS-B

SEÑOR:

DR. JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA

Secretario Técnico de FONDES

Dirección: Calle Dr Ricardo Angulo Ramírez N° 694, Urb Corpac – San Isidro

Lima. –



ASUNTO : Remite Informe Final de Intervenciones Financiadas con Recursos de FONDES

REF. : Informe Final

.....
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, y al mismo tiempo remitirle el informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al periodo de 04 de Octubre al 04 de Noviembre del año 2019.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
BAGAZAN - RIO UCAYALI
JOSÉ ALVARO GARCÍA TORRES
ALCALDE

Oficina de Coordinación calle Unión n° 513-Iquitos
Correo Electrónico: munisaquena2019@gamil.com
celular N°966684922

INFORME FINAL

DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES
(Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA	
ALCALDIA	
EJECUCIÓN	
FECHA	23-01-2020
IMPORTE	10.50 ur
MONEDA	ur
OTRO	1

010

- I. 301460 MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
II. 301460 MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
III. NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN ("LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO UCAYALI EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA DE FLOR DE CASTAÑA A BAGAZAN DEL DISTRITO DE SAQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO")

IV. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- Departamento LORETO
- Provincia REQUENA
- Distrito SAQUENA
- Localidad FLOR DE CASTAÑA - BAGAZAN
- Coordenadas UTM de la intervención (según solicitud de financiamiento).

V. ANTECEDENTES

Describir:

- D.S. 265-2019-EF
- Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia (de ser el caso)
- Resolución Administrativa y Finanza N° 053-2019-MDS-DAF

VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- Alquiler de Bote Motor de 5 tn con fuera de borda de 60 hp (inc. Combustible)
Se Utilizó el bote motor para el transporte del personal hacia el lugar donde está considerado limpieza y descolmatación
Con apoyo del personal de la municipalidad en el manejo de los botes motores.
- Alquiler de Motofurgon 250cc
Dicho motofurgon es para el transporte del personal en los lugares donde esta considerado la limpieza.
Se contrato personal para el manejo de los motofurgon que fueron alquilado para dicho servicio.
- Alquiler de Moto sierra Stihl 070 (Incluye Combustible)
Se utilizo en los trabajos de limpieza de la Descolmatación de rio Ucayali de tronco que esta incrustado desde el fondo del rio Ucayali.
Se contrato personal en el manejo de la motosierra que fuero alquilado para este proyecto.
- Transporte de Bote Motor por el Rio Ucayali
Esta partida se utilizo para el transporte de las herramientas y combustible a utilizar y otros.
Con apoyo del personal de la municipalidad en el manejo de los botes motores

- **Transporte de Motofurgon 250cc por el Rio Ucayali**
Esta partida se utilizo para el transporte de las maquinaria a utilizar en el servicio de defensa Ribereña inicio y Final del Trabajo.
Con apoyo del personal de la municipalidad en el manejo de los botes motores
 - **Comunidad de Flor de Castaña - Bagazan**
Coordenada UTM INICIO

ESTE	NORTE
654032	9472613

 Coordenada UTM FINAL

ESTE	NORTE
660150	9477703
- Longitud proyectada 11,5 Km

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

La población Beneficiando es la capital de Bagazan y la comunidad de Flor de Castaña con una población de 1800 habitantes Considerar en número de habitantes y localidades a la que pertenecen

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

- Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas
Según componentes/partidas/actividades detalladas en el presupuesto que han sido priorizadas por la Comisión Multisectorial identificando aquellos que han sido modificados (no ejecutados total o parcialmente).

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	("LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO UCAYALI EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA DE FLOR DE CASTAÑA A BAGAZAN DEL DISTRITO DE SAQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO")			
	COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES:	METAS FÍSICAS		
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
Servicio de Alquiler de Bote Motor de 5 Tn con fuera de borda de 60 Hp	Hm	184.00	184.00	0.00
Servicio de Alquiler de Motofurgon 250 cc	HM	429.3333	429.3333	0.00
Servicio de Alquiler de Motosierra STHIL 0.70	HM	184.00	184.00	0.00
Servicio de Transporte de Bote motor por el Rio Ucayali	Viaje	2.00	2.00	0.00
Servicio de Transporte de Motofurgon por el Rio Ucayali	Viaje	2.00	2.00	0.00

- Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas
Según componentes/partidas/actividades del presupuesto ejecutados financieramente por la Unidad Ejecutora identificando los saldos para su extorno respectivo.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO....."		
	COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES:	METAS FINANCIERAS	
MONTO PROGRAMADO (1)		MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) - (2)
Servicio de Alquiler de Bote Motor de 5 Tn con	37,230.00	37,230.00	0.00

008

fuera de borda de 60 Hp			
Servicio de Alquiler de Motofurgon 250 cc	22,540.00	22,540.00	0.00
Servicio de Alquiler de Motosierra STHIL 0.70	4,508.00	4,508.00	0.00
Servicio de Transporte de Bote motor por el Río Ucayali	3,850.00	3,850.00	0.00
Servicio de Transporte de Motofurgon por el Río Ucayali	675.00	675.00	0.00

IX. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- Fecha de inicio de ejecución física **04 DE OCTUBRE 2019**
- Fecha de término de la ejecución física **04 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

X. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

De ser el caso en el rubro correspondiente:

- En la incorporación **No**
- En el proceso de selección **No**
- En la ejecución física **No**
- En la ejecución financiera **No**

XI. CONCLUSIONES

EL PROYECTO AH MEJORADO LA VIA DE CIRCULACION ACUATICA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DE CASTAÑA CON LA CAPITAL DEL DISTRITO BAGAZAN.

XII. RECOMENDACIONES

QUE LOS PROYECTO SE DEBERIA CONSIDERAR SEGURIDAD AL PERSONAL DE CAMPO


XIII. ANEXOS

- CUADROS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA MESAUALES
- CONSTANCIA DE VISITAS
- ALBUM FOTOGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
- OTROS

NOTA OBLIGATORIA:

El presente Informe, deberá ser remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendarios, contados a partir de la culminación de la intervención (Artículo 12 – DS N° 132 – 2017-EF).


VISTA PANORAMICA DE LIMPIEZA DE LA QUEBARAD FLOR DE CASTAÑA BAGAZAN

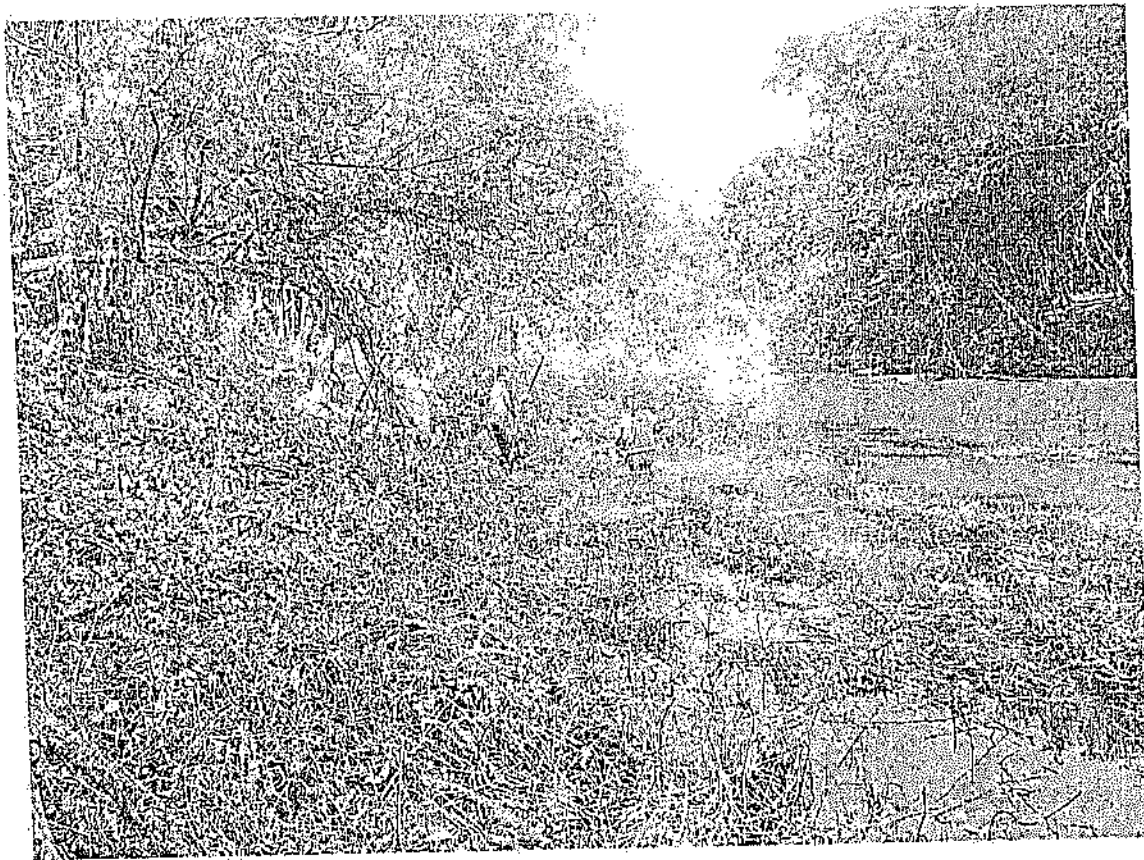


P



VISTA PANORAMICA DE LIMPIEZA DE LA QUEBRAD FLOR DE CASTAÑA BAGAZAN

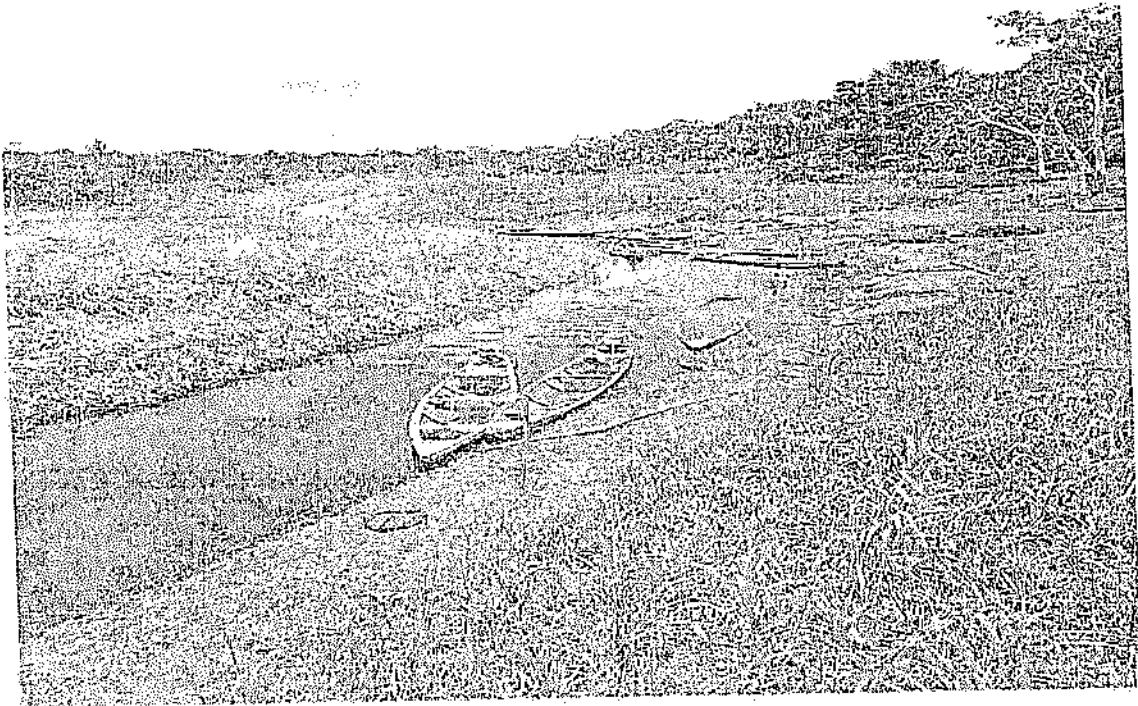

R

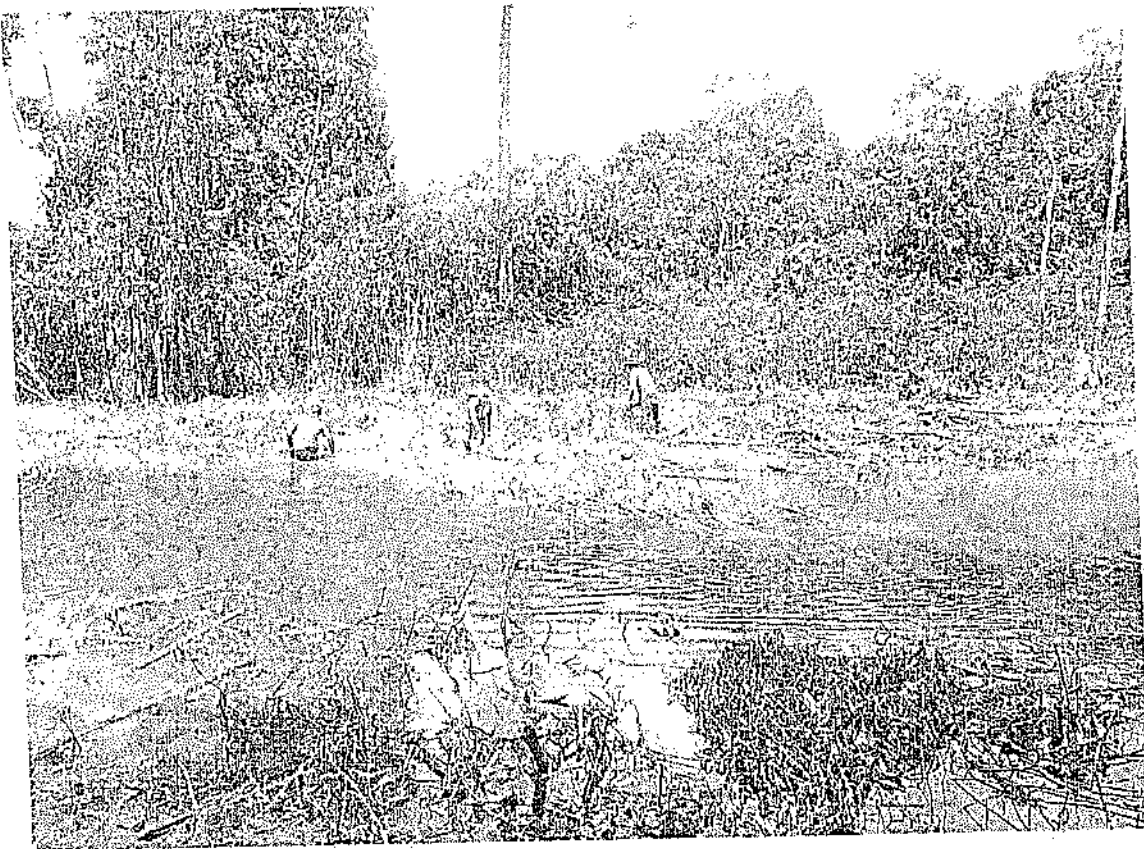

CONSTANCIA DE VISITA

Siendo las 09 horas del día de 05 de Noviembre de 2019, se hizo una inspección de parte de la oficina de Obra de la Municipalidad a verificar como se encuentra el avance y se pudo constatar que esta avanzando de acuerdo a lo programado en su plan de trabajo en dicha inspección, se realizó y el Sr Ruller Gutiérrez García, (e) (Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura):

Intervenciones para la mitigación y capacidad de respuesta/ Intervenciones por peligro inminente, respuesta y rehabilitación denominada:

Inversión / Actividad: Limpieza y descolmatación del Río Ucayali en el Sector de la Comunidad de Flor de Castaña a Bagazán del Distrito de Saquena, Provincia de Requena-Departamento de Loreto", por el monto de S/. 98,200.00.

1. Plazo de Ejecución : 30 días calendario.
2. Fecha de Término de(l) la Proyecto/ Actividad programado: 04/10/2019.
3. Fecha de Término de(l) la Proyecto/ Actividad real : 04/11/2019

Se adjuntad fotos de Dicha Inspección

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
BAGAZAN RÍO UCAYALI

Ruller Gutiérrez García
Asistente Técnico

FOTOGRAFÍA N° 03:




FOTOGRAFÍA N° 04:


PR



FOTOGRAFÍA N° 01:

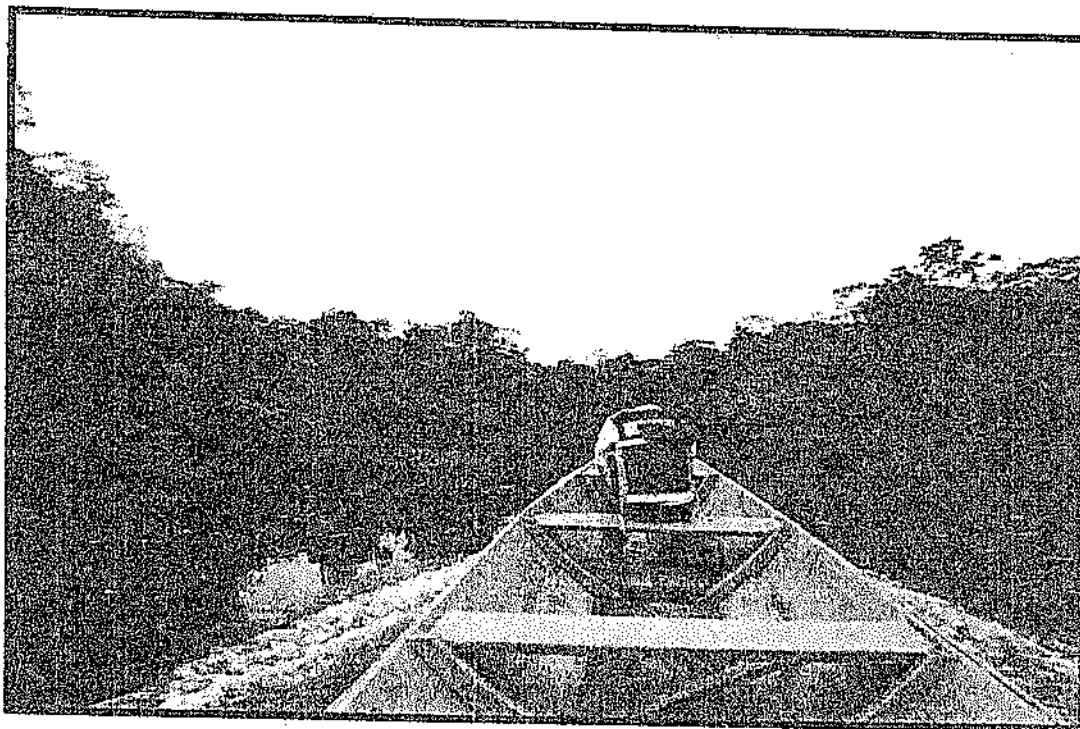

FOTOGRAFÍA N° 02:

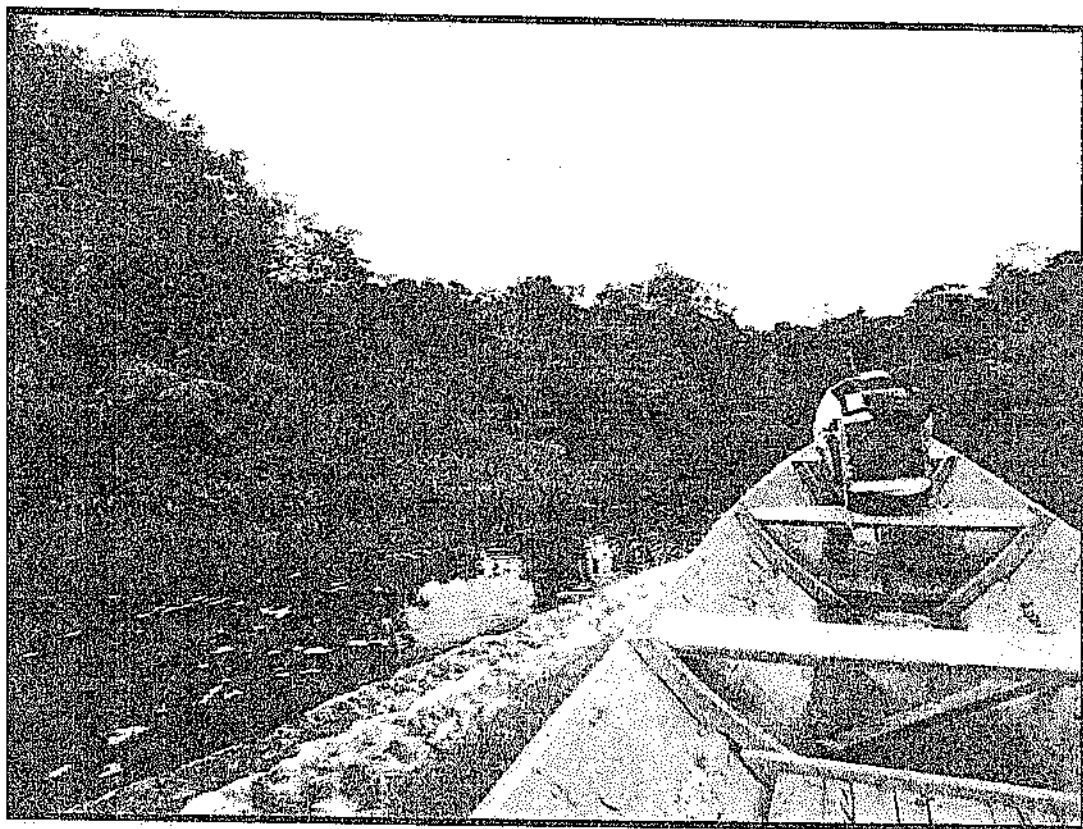

P

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30455
FONDO PARA INTERVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS

DECRETO SUPLENTE N° 132-2017-EF
 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
 (artículo 17, literales 12.1 y 13.1)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 02

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA	CODIGO DEL PLIEGO	301460
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA	CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA	301460
DECRETO SUPLENTE QUE AUTORIZA LOS RECURSOS	FECHA DE APROBACIÓN DEL DECRETO SUPLENTE	MONTO TOTAL AUTORIZADO S/ (s)	98,250.00
REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES	FECHA DEL REPORTE	N° DE INTERVENCIÓNES	2
ACTIVIDAD			

N°	DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	UBICACIÓN			Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/	N° de Resolución de Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de incorporación de recursos	Monto de la Incorporación		Avance Financiero			Unidad de Medida (UM)	Avance % (s/s)	Meta física prevista (a)	Meta física realizada (b)	Meta física ejecutada (c)	Avance (d)
		Región	Provincia	Distrito					Localidad	Comprobado	Declarado	Total (b)							
		GG.3	GG.6	GG.3					GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6						
1	Limpieza y Descontaminación del Río Urayali en el Sector de la Comunidad Nueva Flor de Castaña, del Distrito de Saqueena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto	Loreto	Requena	Saqueena	Castaña	89,250.00	028-2019-A-028-2019-A	21/08/2018	89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	DEFENSA RIBERENA CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA LA CONFORMIDAD DE DIQUES A ORILLA DE LA COMUNIDAD DE BACAZAN DEL DISTRITO DE BACAZAN, PROVINCIA DE REQUENA, DE LORETO	Loreto	Requena	Saqueena	BACAZAN	151,143.00	028-2019-A-028-2019-A	21/08/2018	151,143.00	151,143.00	0.00	0.00	151,143.00	0.00	0.00	33.05%	33.05%	33.05%	33.05%
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.05%

Tipo de Intervención	1
Asignación y Cantidad de Presupuesto	2
Unidad Ejecutora, Recursos y Habilitación	3
Intervenciones	3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
 BACAZAN PRO CAVAL
 FIRMA Y SELLO
 Nombre: CARLOS ALBERTO ALBERTO BELTRUCCI
 Cargo: Responsable del Proyecto de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
 FIRMA Y SELLO
 Nombre: José Alvaro García Torres
 Cargo: Titular del Presupuesto Ejecutor

200

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30459

FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS

DECRETO SUPLENTO N° 132-2017-EF

CONFORMACION Y FUNCIONES DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES

(Artículo N° 13, numerales 13.1 y 13.2)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 01

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA**

DECRETO SUPLENTO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS: **216-2019-PCM**

FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPLENTO: **OCTUBRE**

FECHA DEL REPORTE: **OCTUBRE**

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES: **OCTUBRE**

TIPO DE INTERVENCIONES: **ACTIVIDAD**

CODIGO DEL PLIEGO: **301460**

CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA: **301460**

MONTO TOTAL AUTORIZADO S/ (3): **98,290.00**

LINCEJADO MONTEGRO

N° DE INTERVENCIONES: **2**

N° de Tipo de Intervención (*): **2**

N°	DENOMINACION DE LA INTERVENCION	Ubicación			Plazo de Ejecucion (en días calendario)	Monto de la Intervencion S/	N° de Ejecución de Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Monto de la Incorporación		Certificado	Disponibilidad			Apayas Financiero			Avances Físicos				Avance % (B/A)	Unidad de Medida (U/M)	Meta física mensual (a)	Meta física acumulada mensual (b)	Meta física ejecutada acumulada (c)	Avance % (d/c)						
		Region	Provincia	Distrito					Localidad	GG.3		GG.6	GG.9	GG.3	GG.6	GG.9	GG.3	GG.6	GG.9	Total (e)	Meta física mensual (a)							Meta física acumulada mensual (b)	Meta física ejecutada acumulada (c)				
																														00.0	00.0	00.0	00.0
1	Limpieza y Descontaminación del Rio Umayali en el Sector de la Comunidad Hálava Flor de Castaña, del Distrito de Saquena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto	Loreto	Requena	Saquena	Flor de Castaña	30	98,290.00	066-2019-A-MDS	21/08/2019	88,290.00	00.0	29,487.00	00.0	00.0	00.0	29,487.00	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	29,487.00	30.00%	Global	90.00	90.0%	90.0%	90.0%					
2										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Intervenciones:	(*)
Mitigación y Capacidad de Respuesta	1
Pliego Ambiental, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

Firma y Sello: **SAQUENA DISTRITO SAQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO**

Nombre: **DR. CARLOS GUERRA SALAZAR DEL ASAY**

Cargo: **RESPONSABLE TECNICO DE DESASTRES NATURALES INFRAESTRUCTURA**

Firma y Sello: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA**

Nombre: **ROSA ANWARO GARCIA TORRES**

Cargo: **Trabaja del Pliego Unidad Ejecutora ALCALDE**

001

INFORME FINAL

DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES.
(Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)

REGISTRACION DE OBRAS DE MANEJO DE AGUAS
ALCALDIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
FECHA: 23-01-2020
CAP: 10.50 ar
FIRMA: [Firma]

010

- I. 301460 MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
II. 301460 MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
III. NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN ("LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO UCAYALI EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA DE FLOR DE CASTAÑA A BAGAZAN DEL DISTRITO DE SAQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO")

IV. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- Departamento LORETO
- Provincia REQUENA
- Distrito SAQUENA
- Localidad FLOR DE CASTAÑA - BAGAZAN
- Coordenadas UTM de la intervención (según solicitud de financiamiento).

V. ANTECEDENTES

Describir:

- D.S. 265-2019-EF
- Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia (de ser el caso)
- Resolución Administrativa y Finanza N° 053-2019-MDS-DAF

VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- Alquiler de Bote Motor de 5 tn con fuera de borda de 60 hp (inc. Combustible)
Se Utilizó el bote motor para el transporte del personal hacia el lugar donde está considerado limpieza y des colmatación
Con apoyo del personal de la municipalidad en el manejo de los botes motores
- Alquiler de Motofurgon 250cc
Dicho motofurgo es para el transporte del personal en los lugares donde esta considerado la limpieza.
Se contrato personal para el manejo de los motofurgon que fueron alquilado para dicho servicio.
- Alquiler de Moto sierra Stihl 070 (Incluye Combustible).
Se utilizo en los trabajos de limpieza de la Descolmatación de rio Ucayali de tronco que esta incrustado desde el fondo del rio Ucayali.
Se contrato personal en el manejo de la motosierra que fuero alquilado para este proyecto.
- Transporte de Bote Motor por el Rio Ucayali
Esta partida se utilizo para el transporte de las herramientas y combustible a utilizar y otros.
Con apoyo del personal de la municipalidad en el manejo de los botes motores

- **Transporte de Motofurgon 250cc por el Río Ucayali**
Esta partida se utilizo para el transporte de las maquinaria a utilizar en el servicio de defensa Ribereña inicio y Final del Trabajo.
Con apoyo del personal de la municipalidad en el manejo de los botes motores

- **Comunidad de Flor de Castaña - Bagazan**
Coordenada UTM INICIO

ESTE	NORTE
654032	9472613

 Coordenada UTM FINAL

ESTE	NORTE
660150	9477703

Longitud proyectada 11,5 Km

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

La población Beneficiando es la capital de Bagazán y la comunidad de Flor de Castaña con una población de 1800 habitantes Considerar en número de habitantes y localidades a la que pertenecen

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

- Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas
Según componentes/partidas/actividades detalladas en el presupuesto que han sido priorizadas por la Comisión Multisectorial identificando aquellos que han sido modificados (no ejecutados total o parcialmente).

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:		("LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO UCAYALI EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA DE FLOR DE CASTAÑA A BAGAZAN DEL DISTRITO DE SAQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO")		
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
Servicio de Alquiler de Bote Motor de 5 Tn con fuera de borda de 60 Hp	Hm	184.00	184.00	0.00
Servicio de Alquiler de Motofurgon 250 cc	HM	429.3333	429.3333	0.00
Servicio de Alquiler de Motosierra STHIL 0.70	HM	184.00	184.00	0.00
Servicio de Transporte de Bote motor por el Río Ucayali	Viaje	2.00	2.00	0.00
Servicio de Transporte de Motofurgon por el Río Ucayali	Viaje	2.00	2.00	0.00

- Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas
Según componentes/partidas/actividades del presupuesto ejecutados financieramente por la Unidad Ejecutora identificando los saldos para su extorno respectivo.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:		"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO....."		
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FINANCIERAS			
	MONTO PROGRAMADO (1)	MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) - (2)	
Servicio de Alquiler de Bote Motor de 5 Tn con	37,230.00	37,230.00	0.00	

fuera de borda de 60 Hp			
Servicio de Alquiler de Motofurgon 250 cc	22,540.00	22,540.00	0.00
Servicio de Alquiler de Motosierra:STHIL 0.70	4,508.00	4,508.00	0.00
Servicio de Transporte de Bote motor por el Rio Ucayali	3,850.00	3,850.00	0.00
Servicio de Transporte de Motofurgon por el Rio Ucayali	675.00	675.00	0.00

IX. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- Fecha de inicio de ejecución física **04 DE OCTUBRE 2019**
- Fecha de término de la ejecución física **04 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

X. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

De ser el caso en el rubro correspondiente:

- En la incorporación **No**
- En el proceso de selección **No**
- En la ejecución física **No**
- En la ejecución financiera **No**

XI. CONCLUSIONES

EL PROYECTO AH MEJORADO LA VIA DE CIRCULACION ACUATICA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DE CASTAÑA CON LA CAPITAL DEL DISTRITO BAGAZAN.

XII. RECOMENDACIONES

QUE LOS PROYECTO SE DEBERIA CONSIDERAR SEGURIDAD AL PERSONAL DE CAMPO


XIII. ANEXOS

- CUADROS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA MESAUALES
- CONSTANCIA DE VISITAS
- ALBUM FOTOGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
- OTROS

NOTA OBLIGATORIA:

El presente Informe, deberá ser remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la culminación de la intervención (Artículo 12 – DS N° 132 – 2017-EF).



VISTA PARANORAMICA DE LIMPIEZA DE LA QUEBARAD FLOR DE CASTAÑA BAGAZAN

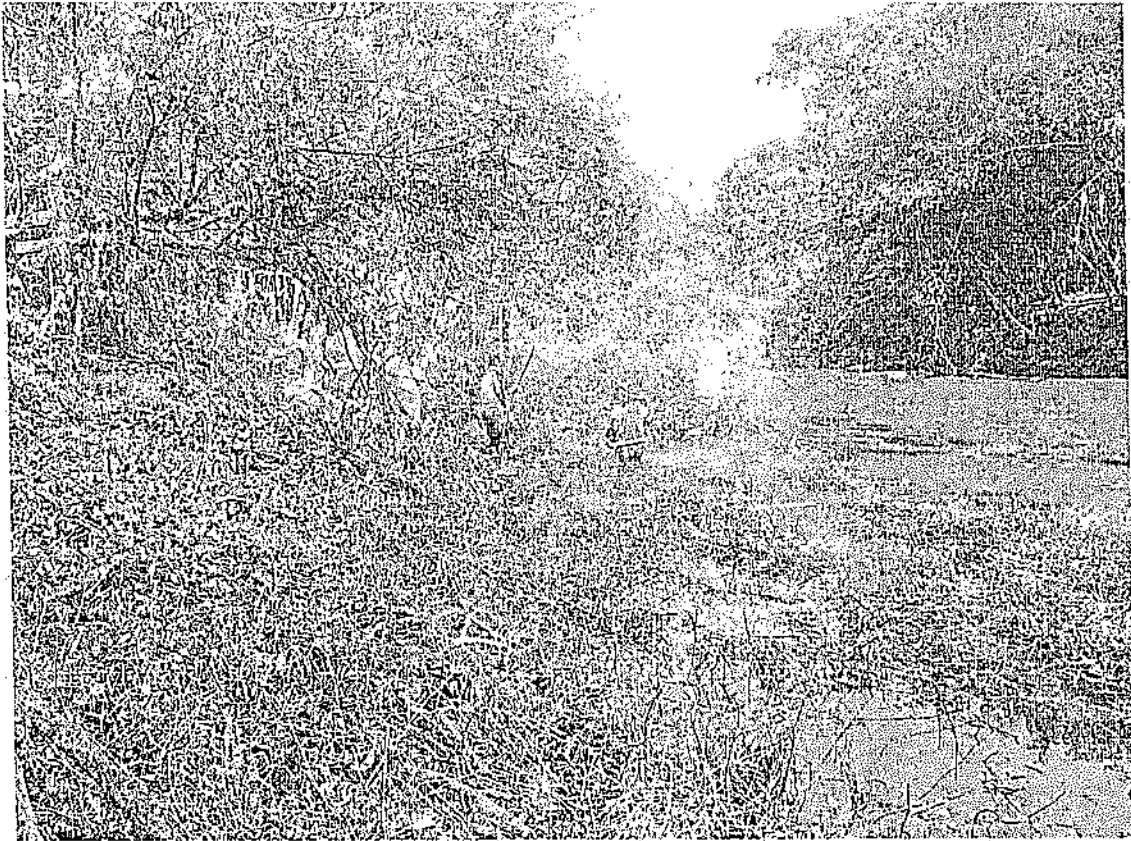

P



VISTA PANORAMICA DE LIMPIEZA DE LA QUEBARAD FLOR DE CASTAÑA BAGAZAN

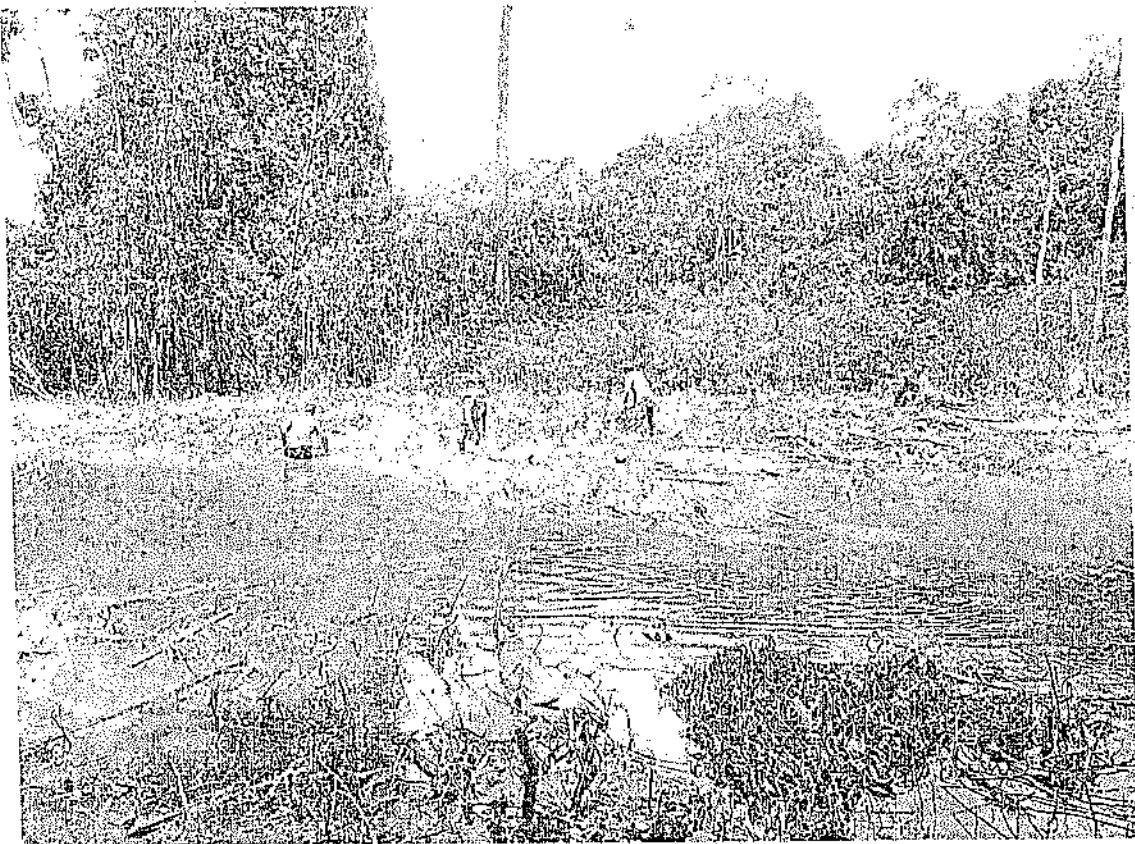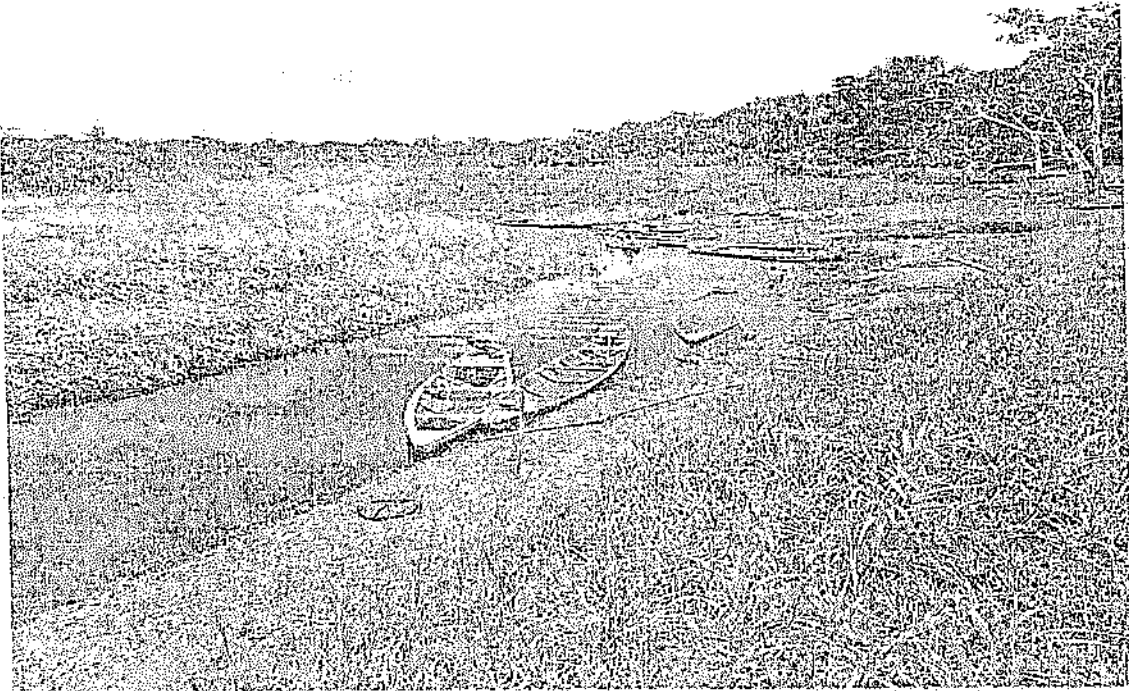

CONSTANCIA DE VISITA


Siendo las 09 horas del día de 05 de Noviembre de 2019, se hizo una inspección de parte de la oficina de Obra de la Municipalidad a verificar como se encuentra el avance y se pudo constatar que esta avanzando de acuerdo a lo programado en su plan de trabajo en dicha inspección, se realizó y el Sr Ruller Gutiérrez García, (e) (Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura):

Intervenciones para la mitigación y capacidad de respuesta/ Intervenciones por peligro inminente, respuesta y rehabilitación denominada:

Inversión / Actividad: Limpieza y descolmatación del Rio Ucayali en el Sector de la Comunidad de Flor de Castaña a Bagazán del Distrito de Saquena , Provincia de Requena-Departamento de Loreto", por el monto de S/. 98,200.00

1. Plazo de Ejecución : 30 días calendario.
2. Fecha de Término de(l) la Proyecto/ Actividad programado: 04/10/2019.
3. Fecha de Término de(l) la Proyecto/ Actividad real : 04/11/2019

Se adjuntad fotos de Dicha Inspección

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
BAGAZAN - RIO UCAVALI

Ruller Gutiérrez García
Asistente Técnico

FOTOGRAFÍA N° 03:




FOTOGRAFÍA N° 04:

R




FOTOGRAFÍA N° 01:

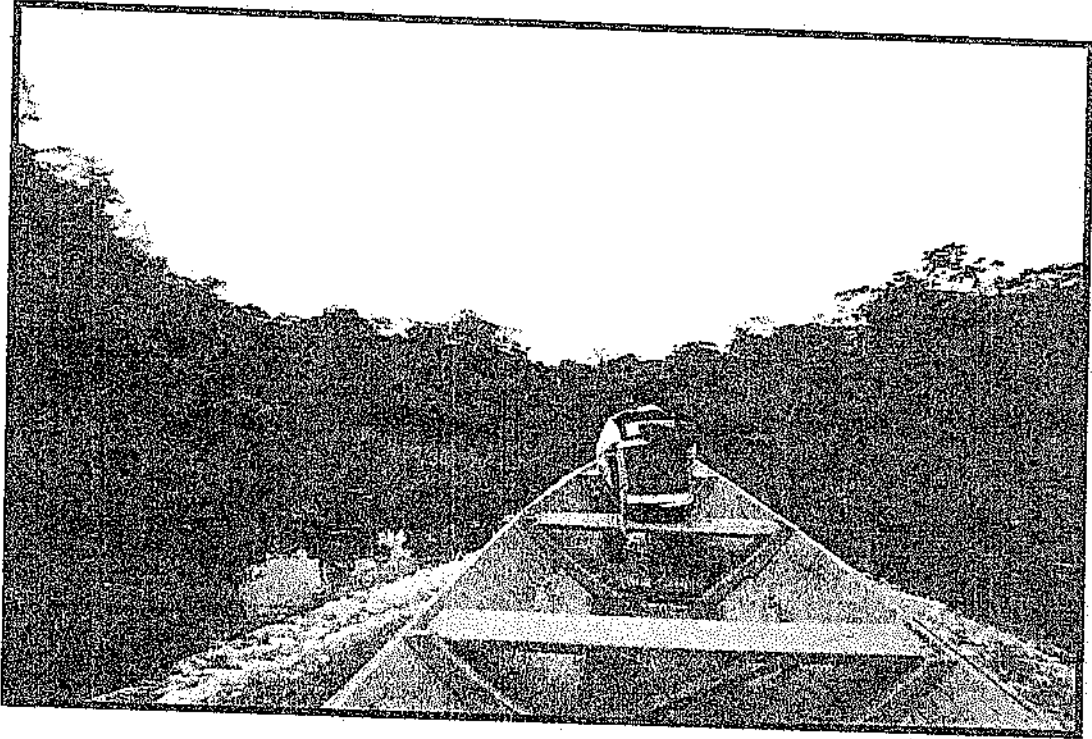

FOTOGRAFÍA N° 02:

R

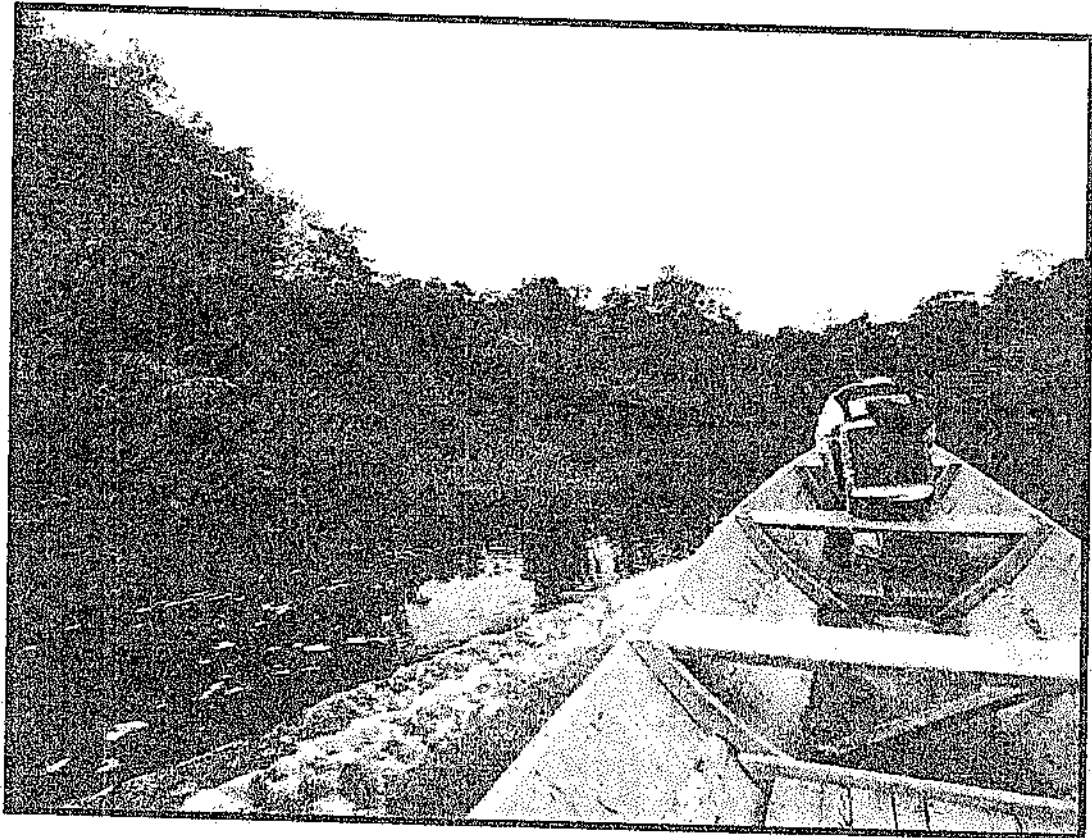

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30453
FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS DECRETO SUPLENTE Nº 132-2017-SC
CONFORMACION Y FUNCIONES DE LA COMISION MULTISectorial DCL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES" (Artículo Nº 10, Numerales 10.3 y 10.4)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 02

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUEENA**
 NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUEENA**
 DECRETOS SUPLENTE QUE AUTORIZA LOS RECURSOS: **216-2019-PCM**
 REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES: **NOVIEMBRE**
 TIPO DE INTERVENCIONES: **ACTIVIDAD**

FECHA DE APROBACION DEL DECRETOS SUPLENTE: **201112010**
 FECHA DEL REPORTE: **201112010**

CODIGO DEL PLIEGO: **301460**
 CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA: **301460**
 MONTO TOTAL AUTORIZADO SI (*): **98,290.00**
 N° DE INTERVENCIONES: **2**

N°	DENOMINACION DE LA INTERVENCION	INFORMACION GENERAL DE LA INTERVENCION				DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO																											
		Region	Provincia	Distrito	Localidad	Plan de Ejecucion (en libros contables)	Monto de la Intervencion SI	N° de Resolucion de Incompetencia de recursos	Fecha de aprobacion, Resolucion de Incompetencia de recursos	Monto de la Incompetencia			Certificado			Compartido			Revisado			Asesor % (b)	Unidad de Medida (U)	Masa Fielde preexistente (c)	Masa Fielde proyectada acumulada (d)	Meta Fielde (Meta Fielde acumulada)	Avance % (e)						
										GO.3	GO.6	GO.9	GO.3	GO.6	GO.9	GO.3	GO.6	GO.9	GO.3	GO.6	GO.9												
1	Limpieza y Descontaminacion del Rio Llorayn en el Sector de la Comunidad Mural Flor de Castilla, del distrito de Saqueena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto	Loreto	Requena	Saqueena	Flor de Castilla	58,280.00	088-2019-A-088-2019-A-088-2019-A-088-2019-A-088-2019-A	21/02/2019	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	70.00%	Chiba	100.00	100.0%	100.0%	
2	DEFENSA RIBERENA CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA LA CONFORMIDAD DE ZIGUER A ORILLA DE LA COMUNIDAD DE BAGAIZAN DEL DISTRITO DE SAQUEENA, PROVINCIA DE REQUENA, DELORETO	Loreto	Requena	Saqueena	BAGAIZAN	151,143.05	088-2019-A-088-2019-A-088-2019-A-088-2019-A-088-2019-A	21/02/2019	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	151,143.00	70.00%	Chiba	100.00	35.85%	66.7%
TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Intervenciones: **3**
 Municipio y Cobertura de la Intervencion: **1**
 Programa Operativo Institucional: **2**
 Mecanismo de Ejecucion: **3**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUEENA
 BAGAIZAN RIO UCAYALI

Firma y Sello: **CARLOS ALBERTO SUAREZ DEL ROSARIO**
 Nombre: **BENEDICTO ANTONIO BARRALLO MORALES**
 Cargo: **RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

Firma y Sello: **JOSE ALVARO GARCIA TORRES**
 Nombre: **JOSE ALVARO GARCIA TORRES**
 Cargo: **TITULAR DE LA MUNICIPALIDAD EJECUTORA**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUEENA

200

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30459
 FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS
 DECRETO SUPLENTO N° 132-2019-DE
 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES
 (Artículo N° 15, numerales 13.1 y 13.2)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 01

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA

DECRETO SUPLENTO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS

FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPLENTO

CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES

FECHA DEL REPORTE

OCTUBRE

TIPO DE INTERVENCIONES

ACTIVIDAD

LINCECIADO MONTEGRO

N° DE INTERVENCIONES

2

N° de Tipo de Intervención (*)

N°	DENOMINACION DE LA INTERVENCION	Ubicación			Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/	N° de Resolución de Inoperación de recursos	Fecha de aprobación de Inoperación de recursos	Monto de la Inoperación			Avance Financiero						Avance Físico			Avance % (B/A)	Unidad de Medida (UM)	Mesa Física prevista mensual (%)	Mesa Física prevista acumulada (%)	Mesa Física efectuada acumulada	Avance % (B/C)		
		Región	Provincia	Distrito					Localidad	C6.3	C6.6	Comprometido		Devengado		Mesa Física prevista acumulada (%)	Mesa Física efectuada mensual	Mesa Física acumulada (%)	Avance % (B)	C6.3							C6.5	C6.6
												C6.3	C6.5	C6.3	C6.5													
1	Limpieza y Descontaminación del Rio Usapari en el Sector de la Comunidad Física Flor de Castilla, del distrito de Saquena, Provincia de Requena, Departamento de Lamberto	Requena	Saquena	Flor de Castilla	30	98,290.00	068-2019-A-MDS	21/08/2019	98,290.00	0.00	0.00	29,487.00	0.00	29,487.00	29,487.00	0.00	29,487.00	0.00	29,487.00	30.00%	980.8	90.00	90.00	90.0%	90.0%			
2																												
3																												
TOTAL									0.00	0.00	0.00	29,487.00	0.00	29,487.00	29,487.00	0.00	29,487.00	30.00%	980.8	90.00	90.00	90.0%	90.0%					

Tipo de Intervenciones	N°
Mantenimiento y Capacitación de Respuerta	1
Reparación, repuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

Firma y Sello:
 Nombre: **Luis Alberto Salazar del Aguayo**
 Cargo: **Responsable del Comité de Seguimiento de la Ejecución de las Actividades**

Firma y Sello:
 Nombre: **José Alvarado García Torrey**
 Cargo: **Titular del Pliego/Unidad Ejecutora**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA
 Nombre: **José Alvarado García Torrey**
 Cargo: **Titular del Pliego/Unidad Ejecutora**
