



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Creado con ley N° 30087 El 29 de Setiembre del 2013



16

**OFICIO N° 008-2020- MDC-A**

SEÑOR,

**ING. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA**  
Secretario Técnico  
Comisión Multisectorial del FONDES  
Calle Ricardo Angulo N°694 N° 694 San Isidro



Lima.- 16 ENE. 2020

**ASUNTO** : REMITO INFORME MENSUAL DE LA INTERVENCION DE LOS RECURSO ASIGNADOS POR EL FONDES

**REF.** : 1) INFORME N°011-2020-MDC/OPP/JCO  
2) INFORME N°012-2020-MDC/OPP/JCO

Es grato de dirigirme a usted, expresándole mi cordial saludo y a la vez remito adjunto los documentos de las referencia, emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Canayre mediante el cual se anexa el informes mensuales de la ejecución física y financiera, correspondiente a los meses de **noviembre y diciembre** de las intervenciones de los recursos asignados por el **FONDES**, de la actividad: **“limpieza, descolmatación y colocación de enrocado al volteo en tramos críticos del cauce del río santa rosa como respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales, ubicado en el C.P. de Santa Rosa perteneciente al distrito de canayre, provincia Huanta-región Ayacucho declarado en estado de emergencia según D.S. N°007-2019-PCM”** por un monto total de S/ 156,223.44

Con la confianza y seguridad que el presente tendrá la atención requerida, me suscribo de usted.

Atentamente

  
Hugo Ferrufino Ruiz  
DNI N° 41404365  
Alcalde

**DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL DE CANAYRE**  
**Municipalidad\_Canayre@hotmail.com**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE**



**#MUNICANAYRE**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

" " Año de la universalización de la salud"

### INFORME N°011-2020-MDC-OPP/JCO



**Al:** ING. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA  
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES

**De:** JANETH CÁRDENAS OTÁROLA  
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

**Asunto:** Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de noviembre

**Referencia:** Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de 2019.

**Fecha:** Canayre 13 de enero del 2020

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 265-2019-EF correspondiente al mes de noviembre del 2019, que detallo a continuación:

#### I. INFORMACIÓN GENERAL:

a) Código y Nombre del Pliego:

050409-301850 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

b) Código y Nombre de la Unidad Ejecutora:

301850 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

c) Tipo de Intervención: MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

d) Monto transferido S/.156,223.44.

e) Dispositivo: Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de 2019

f) Metas previstas de la intervención (mensual)

#### II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

a) De la ejecución financiera:

- Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo con el anexo adjunto. El avance financiero de acuerdo con el cuadro adjunto es cero. Debido a que este mes no se ha ejecutado debido no ingreso la valorización durante el mes.
- Comentarios sobre la ejecución financiera (Detallar en caso de deficiencias en la incorporación y ejecución financiera).
- **DENOMINACION:** "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ENROCADO AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUSE DEL RIO SANTA ROSA COMO RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE LA







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE



" " Año de la universalización de la salud"

OCURRENCIA DE INTENSAS PRICIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL C.P. DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA HUANTA-REGION AYACUCHO"

b) **De la ejecución Física:**

- Avance físico Mensual y acumulado por tipo de intervención de acuerdo con el anexo adjunto es al 100% se ejecutaron todas las partidas en solo 30 días, de lo establecido en 48 días calendarios según la contra suscrita, CONTRATO N°0209-MDC-UASA el 23 de octubre. Iniciando con la ejecución física de la actividad el 01 de noviembre del 2019 y finalizando el 30 de noviembre del 2019.
- Dificultades durante la ejecución física de las intervenciones.  
No hubo ninguna dificultad durante la ejecución de la actividad.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este mes de noviembre se culminó con la ejecución física de todas las partidas al 100%. El inicio de la obra fue el 01/11/2019 y la culminación el 30/11/2019, de lo que estaba programado al 18/12/2019, por lo tanto, indica que se ejecutó en 30 días como consta en la valorización presentada.

Al presente se adjunta:

El reporte mensual de la ejecución física y financiera de las actividades (Anexo 2).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANAYRE  
HUANTA - AYACUCHO  
  
Evelyn Gádenas Otárola  
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
DNI. 42446132





# ANEXO 5-CONTENIDO MINIMO INFORME MENSUAL NOVIEMBRE

- I. **CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE**  
050409-301850 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- II. **CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA**  
301850 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- III. **NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN**  
"LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ENROCADO AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUSE DEL RIO SANTA ROSA COMO RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRICIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL C.P. DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA HUANTA-REGION AYACUCHO DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°007-2019-PCM"
- IV. **UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN**
  - Departamento: Ayacucho
  - Provincia: Huanta
  - Distrito: Canayre
  - Localidad: C.P. de Santa Rosa
  - Coordenadas UTM de la intervención.

**INICIO:**

- 610580.06 ESTE
- 8638424.88 NORTE

**FINAL:**

- 611052.22 ESTE
- 8638626.40 NORTE

**V. ANTECEDENTES**

En centro poblado de Santa Rosa, distrito de Canayre, provincia Huanta, Región Ayacucho, a causa de las intensas lluvias del 05 y 06 de Enero del 2019 se activaron las escorrentías de las quebradas y microcuencas afluentes del rio Santa Rosa, que a la vez generaron deslizamientos y huaycos acompañados de lodo, piedras y arrastre de material suelto e incremento del caudal y fuerza erosiva del rio Santa Rosa afectando así a la población urbana del centro poblado de Santa Rosa por el desborde e inundación de viviendas poniendo en riesgo la integridad de los moradores. Según el informe técnico de defensa civil del distrito de Canayre con el río ha destruido las defensas naturales como vegetaciones por donde se ha desbordado hacia la población de Santa Rosa arrasando en su paso parcelas de Cacao, plátano, yuca, etc. Hasta llegar a las viviendas afectando a las familias que habitan en el centro poblado de Santa Rosa, así mismo el río en su curso viene amenazando a la población de Santa Rosa.

La población en riesgo luego de la colmatación del cauce por desborde e inundación del rio Santa Rosa es de 1200 habitantes entre niños ancianos, gestantes como personas con habilidades especiales y población en general .

Debido a estas ocurrencias climatológicas inusuales se tiene sectores por donde el rio a desbordado habiéndose identificado 4 progresivas, cuyo cause se encuentra colmatado, así también en un progresiva se requiere también la colocación de rocas al volteo por ser zonas críticas identificadas donde ha erosionado el rio Santa Rosa hacia zona urbana de la población, mientras que un progresiva se requiere la conformación de dique para recuperar espacios recuperados y evitar desbordamiento del rio por ser zonas críticas de inundación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE  
HUANTA-AYACUCHO  
Gameniel Oaranda Martinez  
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y Liquidación de obras

## VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La propuesta técnica considera como TRABAJOS PRELIMINARES la movilización y desmovilización en 01 camión semi trayler 330HP 35 Ton, alquilada a todo costo: 01 excavadora sobre orugas de 160-250 HP, desde la provincia de Huamanga- Ayacucho hasta la capital del distrito de Canayre. El tramo para movilizar es: Ayacucho – Quinoa – Machente – Rosario - Sivia – Canayre una distancia de 276.20 km. El tiempo de recorrido del camión plataforma es de 29 horas ida y vuelta. Otra intervención fue MOVIMIENTO DE TIERRA que consiste en la descolmatación del cauce del río, actividad que consistió en la descolmatación y limpieza del Río en las progresivas inicio (X=610580.06, Y=8638424.88) final (X=611052.22, Y=8638626.40). la longitud del proyecto es de 1.185 km, el proceso constructivo durante el periodo comprendido del 01/11/2019 al 30/11/2019 se efectuaron en concordancia estipulado en la ficha técnica, para esta actividad se empleó una excavadora sobre oruga de 209 HP, actividades que se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN DE METAS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Metrado
<b>01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01	desmovilización de maquinaria pesada	GLOBAL	01
<b>02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
02.01	Descolmatación del cauce del río	M3	26859.24
02.02	Conformación de Dique con material propio	M3	7405.95

**INICIO:**

- 610580.06 ESTE
- 8638424.88 NORTE

**FINAL:**

- 611052.22 ESTE
- 8638626.40 NORTE

**Mapa de intervención de la actividad**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE  
 HUANTA - AYACUCHO  
 Gernaniel Gervasio Martínez  
 Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y  
 Liquidación de obras



**VII. CANTIDAD DE POBLACION QUE FUE BENEFICIADA**

La actividad de "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ENROCADO AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUSE DEL RIO SANTA ROSA COMO RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRICIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL C.P. DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA HUANTA-REGION AYACUCHO DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°007-2019-PCM" beneficiara un total de **1, 200** habitantes en el centro poblado de Santa Rosa, entre: niños, madres, ancianos, personas con habilidades especiales y población en general.

**VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS**

- Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas  
las metas físicas programadas durante el mes de noviembre de la actividad se superaron, cabe precisar que programado en 7 semanas logrando ejecutar en solo 4 semanas de mes de noviembre.

**SE EJECUTO EN TOTALIDAD DE PARTIDAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO**

**METAS FISICAS PROGRAMAS Y EJECUTADAS EN MES NOVIEMBRE**

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ENROCADO AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUSE DEL RIO SANTA ROSA COMO RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRICIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL C.P. DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA HUANTA-REGION AYACUCHO DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°007-2019-PCM"			
	<b>METAS FÍSICAS</b>			
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
Movilización y desmovilización de maquinaria al sector de trabajo	Global	1	1	0
<b>LIMPIEZA Y DESCOLMATACION</b>				
Limpieza y descolmatación de cauce del río con excavadora sobre oruga s/oruga	M3	26859.24	26859.24	0
<b>REHABILITACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO</b>				
Conformación de dique con material propio	M3	74505.95	74505.95	0

- Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas  
Las metas financieras programados al mes de noviembre no se ejecutaron, debido a que el ejecutor de la obra presento una sola valorización de la ejecución el 5 de diciembre.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE  
 HUANTA - AYACUCHO  
  
**Gamsiel Garvía Martínez**  
 Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y Liquidación de obras

*perteneciente al distrito de canayre, provincia Huanta-región Ayacucho declarado en estado de emergencia según D.S. N°007-2019-PCM*

**XII. RECOMENDACIONES**

- La valorización de la obra debe ser mensualizada, para el equilibrio de la ejecución físico financiero de la actividad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE  
HUANTA - AYACUCHO  
  
Gamaniel Gamboa Martínez  
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y  
Liquidación de obras





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

"Año de la universalización de la salud"



### INFORME N°012-2020-MDC-OPP/JCO

**AL** : ING. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA  
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES

**DE** : JANETH CÁRDENAS OTÁROLA  
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

**Asunto** : Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de diciembre.

**Referencia** : Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de 2019.

**Fecha** : Canayre 13 de enero del 2020

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 265-2019-EF correspondiente al mes de diciembre del 2019, que detallo a continuación:

#### I. INFORMACIÓN GENERAL:

a) Código y Nombre del Pliego:

050409-301850 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

b) Código y Nombre de la Unidad Ejecutora:

301850 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

c) Tipo de Intervención: MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

d) Monto transferido S/.156,223.44

e) Dispositivo: Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de 2019

f) Metas previstas de la intervención (mensual)

#### II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

a) De la ejecución financiera:

- Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo con el anexo adjunto. El avance financiero de acuerdo con el cuadro adjunto es S/. 156,222.00. lo que indica que se ejecutó al 100% la valorización presentada de la obra.
- Comentarios sobre la ejecución financiera (Detallar en caso de deficiencias en la incorporación y ejecución financiera).

**DENOMINACION:** "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ENROCADO AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUSE DEL RIO SANTA ROSA COMO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

"Año de la universalización de la salud "



RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRICIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL C.P. DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA HUANTA-REGION AYACUCHO"

b) **De la ejecución Física:**

- Avance físico Mensual y acumulado por tipo de intervención de acuerdo con el anexo adjunto es al 100% se ejecutaron todas las partidas en solo 30 días de lo establecido en 48 días calendarios según la contra suscrita, CONTRATO N°0209-MDC-UASA el 23 de octubre. Iniciando con la ejecución física de la actividad el 01 de noviembre del 2019 y finalizando el 30 de noviembre del 2019.
- Dificultades durante la ejecución física de las intervenciones.  
No hubo ninguna dificultad durante la ejecución de la actividad.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este mes de diciembre se culminó con la ejecución física y financiera de todas las partidas al 100%. Habiendo un saldo financiero de S/.1.44(un sol con 44 centavos)

Al presente se adjunta:

El reporte mensual de la ejecución física y financiera de las actividades (Anexo 2).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANAYRE  
HUANTA - AYACUCHO  
  
Jonathan Cortés Otárola  
JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
DNI: 42446132





# ANEXO 5-CONTENIDO MINIMO INFORME MESUAL DICIEMBRE

- I. **CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE**  
050409-301850 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- II. **CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA**  
301850 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

III. **NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN**  
 “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ENROCADO AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUSE DEL RIO SANTA ROSA COMO RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRICIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL C.P. DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA HUANTA-REGION AYACUCHO DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°007-2019-PCM”

- IV. **UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN**
  - **Departamento:** Ayacucho
  - **Provincia:** Huanta
  - **Distrito:** Canayre
  - **Localidad:** C.P. de Santa Rosa
  - **Coordenadas UTM de la intervención.**

- INICIO:**
- 610580.06 ESTE
  - 8638424.88 NORTE

- FINAL:**
- 611052.22 ESTE
  - 8638626.40 NORTE

V. **ANTECEDENTES**

En centro poblado de Santa Rosa, distrito de Canayre, provincia Huanta, Región Ayacucho, a causa de las intensas lluvias del 05 y 06 de Enero del 2019 se activaron las escorrentías de las quebradas y microcuencas afluentes del rio Santa Rosa, que a la vez generaron deslizamientos y huaycos acompañados de lodo, piedras y arrastre de material suelto e incremento del caudal y fuerza erosiva del rio Santa Rosa afectando así a la población urbana del centro poblado de Santa Rosa por el desborde e inundación de viviendas poniendo en riesgo la integridad de los moradores. Según el informe técnico de defensa civil del distrito de Canayre con el río ha destruido las defensas naturales como vegetaciones por donde se ha desbordado hacia la población de Santa Rosa arrasando en su paso parcelas de Cacao, plátano, yuca, etc. Hasta llegar a las viviendas afectando a las familias que habitan en el centro poblado de Santa Rosa, así mismo el río en su curso viene amenazando a la población de Santa Rosa.

La población en riesgo luego de la colmatación del cauce por desborde e inundación del rio Santa Rosa es de 1200 habitantes entre niños ancianos, gestantes como personas con habilidades especiales y población en general .

Debido a estas ocurrencias climatológicas inusuales se tiene sectores por donde el rio a desbordado habiéndose identificado 4 progresivas, cuyo cause se encuentra colmatado, así también en un progresiva se requiere también la colocación de rocas al volteo por ser zonas críticas identificadas donde ha erosionado el rio Santa Rosa hacia zona urbana de la población, mientras que un progresiva se requiere la conformación de dique para recuperar espacios recuperados y evitar desbordamiento del rio por ser zonas críticas de inundación.





## VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La propuesta técnica considera como TRABAJOS PRELIMINARES la movilización y desmovilización en 01 camión semi trayler 330HP 35 Ton, alquilada a todo costo: 01 excavadora sobre orugas de 160-250 HP, desde la provincia de Huamanga- Ayacucho hasta la capital del distrito de Canayre. El tramo para movilizar es: Ayacucho – Quinua – Machente – Rosario - Sivia – Canayre una distancia de 276.20 km. El tiempo de recorrido del camión plataforma es de 29 horas ida y vuelta. Otra intervención fue MOVIMIENTO DE TIERRA que consiste en la descolmatación del cauce del río, actividad que consistió en la descolmatación y limpieza del Río en las progresivas inicio (X=610580.06, Y=8638424.88) final (X=611052.22, Y=8638626.40). la longitud del proyecto es de 1.185 km, el proceso constructivo durante el periodo comprendido del 01/11/2019 al 30/11/2019 se efectuaron en concordancia estipulado en la ficha técnica, para esta actividad se empleó una excavadora sobre oruga de 209 HP, actividades que se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN DE METAS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Metrado
01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01	desmovilización de maquinaria pesada	GLOBAL	01
02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
02.01	Descolmatación del cauce del río	M3	26859.24
02.02	Conformación de Dique con material propio	M3	7405.95


**INICIO:**

- 610580.06 ESTE
- 8638424.88 NORTE

**FINAL:**

- 611052.22 ESTE
- 8638626.40 NORTE

**Mapa de intervención de la actividad**

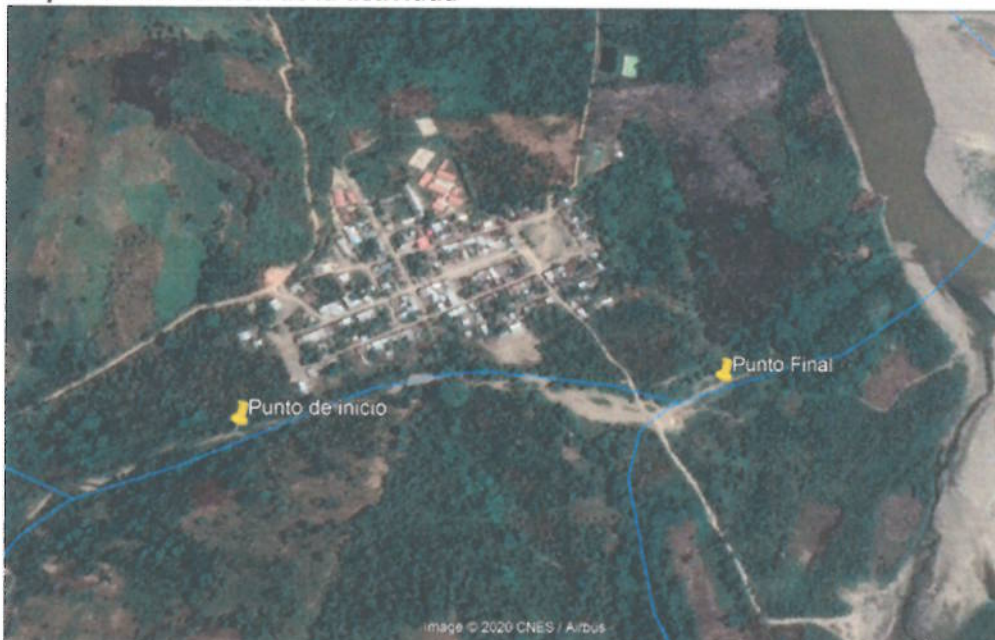

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE  
 HUANTA - AYACUCHO  
 Gamañel Garvía Martínez  
 Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y  
 Liquidación de obras

## VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

La actividad de "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ENROCADO AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUSE DEL RIO SANTA ROSA COMO RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRICIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL C.P. DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA HUANTA-REGION AYACUCHO DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°007-2019-PCM" beneficiara un total de 1, 200 habitantes en el centro poblado de Santa Rosa, entre: niños, madres, ancianos, personas con habilidades especiales y población en general.

## VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

- Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas  
Las metas físicas programadas durante el mes de diciembre de la actividad fueron ejecutados en el mes de noviembre, cabe precisar que programado en 7 semanas se logró ejecutar en solo 4 semanas.

### METAS FISICAS PROGRAMAS Y EJECUTADAS EN MES NOVIEMBRE

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ENROCADO AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUSE DEL RIO SANTA ROSA COMO RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRICIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL C.P. DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA HUANTA-REGION AYACUCHO DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°007-2019-PCM"			
	METAS FÍSICAS			
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
Movilización y desmovilización de maquinaria al sector de trabajo	Global	0	0	0
<b>LIMPIEZA Y DESCOLMATACION</b>				
Limpieza y descolmatación de cauce del río con excavadora sobre oruga s/oruga	M3	0	0	0
<b>REHABILITACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO</b>				
Conformación de dique con material propio	M3	0	0	0

- Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas  
Las metas financieras programados al mes de noviembre no se ejecutaron, debido a que el ejecutor de la obra presento una sola valorización de la ejecución el 5 de diciembre. Por lo tanto, el mes de diciembre financieramente se ejecutó.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE  
HUANTA-AYACUCHO  
Gamariel Garvía Martínez  
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y  
Liquidación de Obras



**METAS FINANCIERAS PROGRAMADAS**

<b>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:</b>	"LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ENROCADO AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUSE DEL RIO SANTA ROSA COMO RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRICIPITACIONES PLUVIALES, UBICADO EN EL C.P. DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA HUANTA-REGION AYACUCHO DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN D.S. N°007-2019-PCM"		
<b>COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES</b>	<b>METAS FINANCIERAS</b>		
	<b>MONTO PROGRAMADO (1)</b>	<b>MONTO EJECUTADO (2)</b>	<b>SALDO (1) - (2)</b>
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
Movilización y desmovilización de maquinaria al sector de trabajo	13,944.00	13,944.00	0.00
<b>LIMPIEZA Y DESCOLMATACION</b>			
Limpieza y descolmatación de cauce del rio con excavadora sobre oruga s/oruga	102,065.12	102,065.12	0.00
<b>REHABILITACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO</b>			
Conformación de dique con material propio	40,214.32	40,214.32	0.00
<b>TOTAL, S/</b>	<b>156,223.44</b>	<b>156,223.44</b>	<b>0.00</b>

**IX. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- Fecha de inicio de ejecución: 01/11/2019
- Fecha de término de la ejecución física: 18/12/2019
- Días ejecutados: 48 días calendario

**X. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN**

De ser el caso en el rubro correspondiente:

- En la incorporación  
NINGUNA
- En el proceso de selección.  
NINGUNA
- En la ejecución física.  
NINGUNA
- En la ejecución financiera.  
NINGUNA

**XI. CONCLUSIONES.**

La ejecución física programada para el mes de diciembre fue ejecutado durante el mes de noviembre, y la ejecución financiera al 100% se ejecutó en el de diciembre de la actividad: *"limpieza, descolmatación y colocación de enrocado al volteo en tramos críticos del cauce del rio santa rosa como respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales, ubicado en el cp. de Santa Rosa perteneciente al distrito de canayre, provincia Huanta-región Ayacucho declarado en estado de emergencia según D.S. N°007-2019-PCM"*

**XII. RECOMENDACIONES**

- La valorización de la obra debe ser mensualizada, para el equilibrio de la ejecución físico financiero de la actividad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE  
HUANTA-AYACUCHO  
Gamasiel Garysba Martínez  
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y  
Liquitación de obras
